




GRAĐEVNI DNEVNIK		Znak		Naziv i središte izvođača		List	1
		JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin				Nadnevak upisa	ponedjeljak 27.01.2020.
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva	
Stambena građevina, (Pr), k.č. broj 1172/3 k.o. Komiža				°C	%	°C	
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača							
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici				Strojevi		
	voditelj građenja						
Broj	1						
<p>Upis i potpis nadzornog inženjera</p> <p>Između naručitelja Slaven Kevo Biševska 3 investitora i "Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Cvrk Zdravko dipl.ing.građ" G 370 Ivana Meštrovića 32, Zagreb -Dubrava potpisan je Ugovor 27.01.2020 god. u obavljanju poslova stručnog nadzora izgradnje stambenog zgrade na adresi Komiža-Put Kamenica k.č.br 1172/3 k.o. Komiža. Temeljem građevinske dozvole klase UP/I-361-03/18-01/000045,ur.br 2181/1-11-00-09/01-19-0005 prijavljen je početak gradnje 03.02.2020.god. stambena zgrada na k.č.br 1172/3 k.o. Komiža. Uvidom u glavni Projekt Arhitekture knjiga 1 Zop GL 17-18 TD 941/18 od kolovoza 2018.god, a prema Zakonu o građenju NN 153/13,20/17 članak 58.st4,5 nadzorni inženjer u provedbi nadzora i građenja objekta bez odgode je upoznao investitora sa svim nedostacima, odnosno na nepravilnosti koji je uočio u glavnom projektu Arhitekture knjiga 1 Zop GL 17-18 TD 941/18, a odnosi se na ne ispunjavanje bitnih zahtjeva i to: trajnost, održivost i ekološke zahtjeve utvrđene (Anex Uredbe (EU) br. 305/2011, Zakonom o gradnji NN br.153/13, 20/17). Traži se izmjena projektiranog sistema građenja u Simprolit sistem koji isti ima trajniji i održivi eko sistem gradnje za zidove i stropove objekta dijela objekta i to građevinske materijale za zidove, slojeve ravne krovne ploče i slojevi poda toplinsko-izolacijskog sloja, veći stupanj sigurnosti od potresa za nosivu konstrukciju objekta. Iste izmjene imaju bolja tehničkih svojstava od istih predviđeno glavnim projektom ili građevinskom dozvolom u skladu su s temeljnim zahtjevima za građevinu (Anex Uredbe (EU) br. 305/2011, Zakon o gradnji NN br.153/13, 20/17). Bitni temeljni zahtjevi se dokazuju s atestnom tehničkom dokumentacijom koji se prilažu uz tehničku dokumentaciju za Uporabnu dozvolu.</p> <p>Izmjena ili dopuna materijala predviđena tehničkom dokumentacijom i glavnim projektom određenih dijelova građevine se izvršava bez izmjene ili dopune građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom prema čl 5. Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14,41/15,75/15) .</p> <p>Nakon izvođenja objekta izrađuje se po Zakonu o građenju za uporabnu dozvolu Energetski elaborat za dokaz projektiranog stupnja energetske učinkovitosti objekta.</p> <p>Ugrađeni materijal ne smiju biti lošije kvaliteta od projektom predviđenog niti po jednom od parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar, zvučnost) I isti će se dokazati uvidom u atestnu dokumentacijom i ispitivanjima (zvučnost, termika itd) Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.</p>							
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer			
Željko Lukašević, dipl.ing.građ. 27.01.2020.				Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.			
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis			


GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak		Naziv i središte izvođača		List	2																
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303		Gornji Karin		Nadnevak upisa	utorak																
					28.1.2020																	
Naziv građevine / dijela građevine / radova			Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva																
Stambena građevina, (Pr), k.č. broj 1172/3 k.o Komiža			vedro	20 °C	%	°C																
Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača																						
Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										Strojevi											
	voditelj građenja																					
Broj	1																					
Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik																						
<p>Dana 31.01.2020. godine izvođač radova uveden u posao u posao prema građevinskoj dozvoli UP/I-361-03/18-01/00045.urb.br 2181/1-11-00- 09/01-13-005 od 27.08.2019 godine. Izvršna 20.09.2019.Predata je projektna od investitora projektna dokumentacija .Izvršena je prijava početka rada od 03.02. 2020 god. Za izgradnju zgrade izvodi izvoditelj Jadria Modul j. d.o.o. Zadar , OIB: 10713534303 .radove po odobrenoj tehničkoj dokumentaciji</p>																						
Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba																						
<p>Izvođač uveden u posao za izvedbu radova po Ugovoru o građenju od 27.01.2020.god investitora Kevo Slaven OIB 79635574592,Komiža i izvođača Jadria Modul j.d.o.o.</p>																						
<p>Izvođač Ugovorene radove prema čl 3 Ugovora o građenju s rokom izvođenja od 6.mjeseci i to od početak radova 10.02.2020 god do završetak radova 15.08.2020 godine. Ugovoreni rokovi mogu se produžiti :- zbog izmjene investicijske tehničke dokumentacije -zbog dodatnih radova ,izvedeni na pismeni zahtjev Naručitelja -zbog utjecaja treće osobe koja onemogućuje gradnju. Prema čl 13 Ugovora o građenju Izvođač jamči za kvalitetu radova na 10 godina nakon izdavanje uporabne dozvole . U tom vremenu izvođač po pozivu Naručitelja i o svom trošku mora otkloniti sve nedostatke na objektu ,koje su posljedica slabe kvaliteta izvedbe. Izvođač Jadria Modul j.do.o. Gornji Karin Izjavljuje za ugrađeni Simprolit materijal eko održive gradnje trajnost kvaliteta materijala i sistema gradnje proizvođača Simprolit d.o.o. je 50 i više godina. Za ostale ugrađene materijale važeći su garantni rokovi proizvođača. Zdravko Cvrk dipl.ing.građ.</p>																						
Odgovorna osoba koja vodi gradnju				Glavni / Nadzorni inženjer																		
<p>Željko Lukašević, dipl.ing.građ.</p> <p>28.1.2020.</p>				<p>Zdravko Cvrk, dipl.ing.građ.</p>																		
nadnevak i potpis				nadnevak i potpis																		




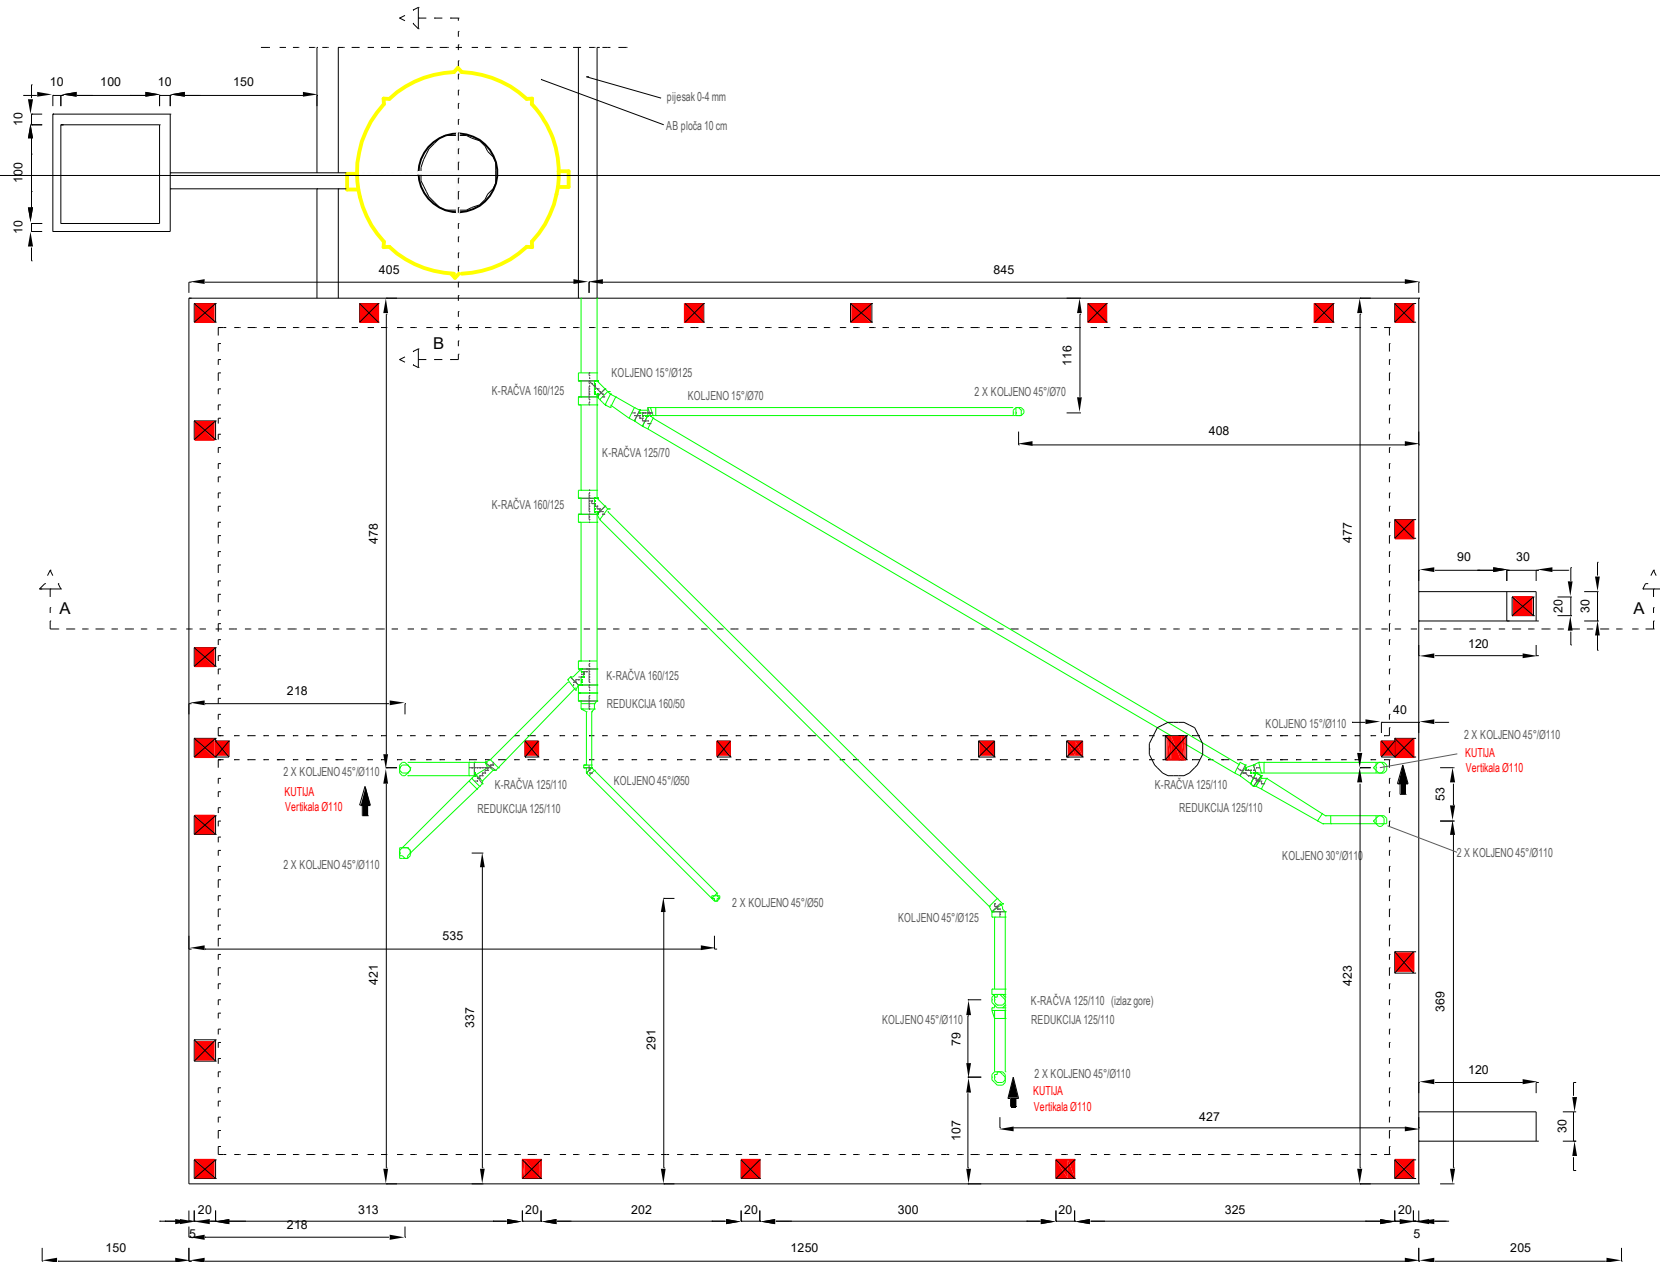


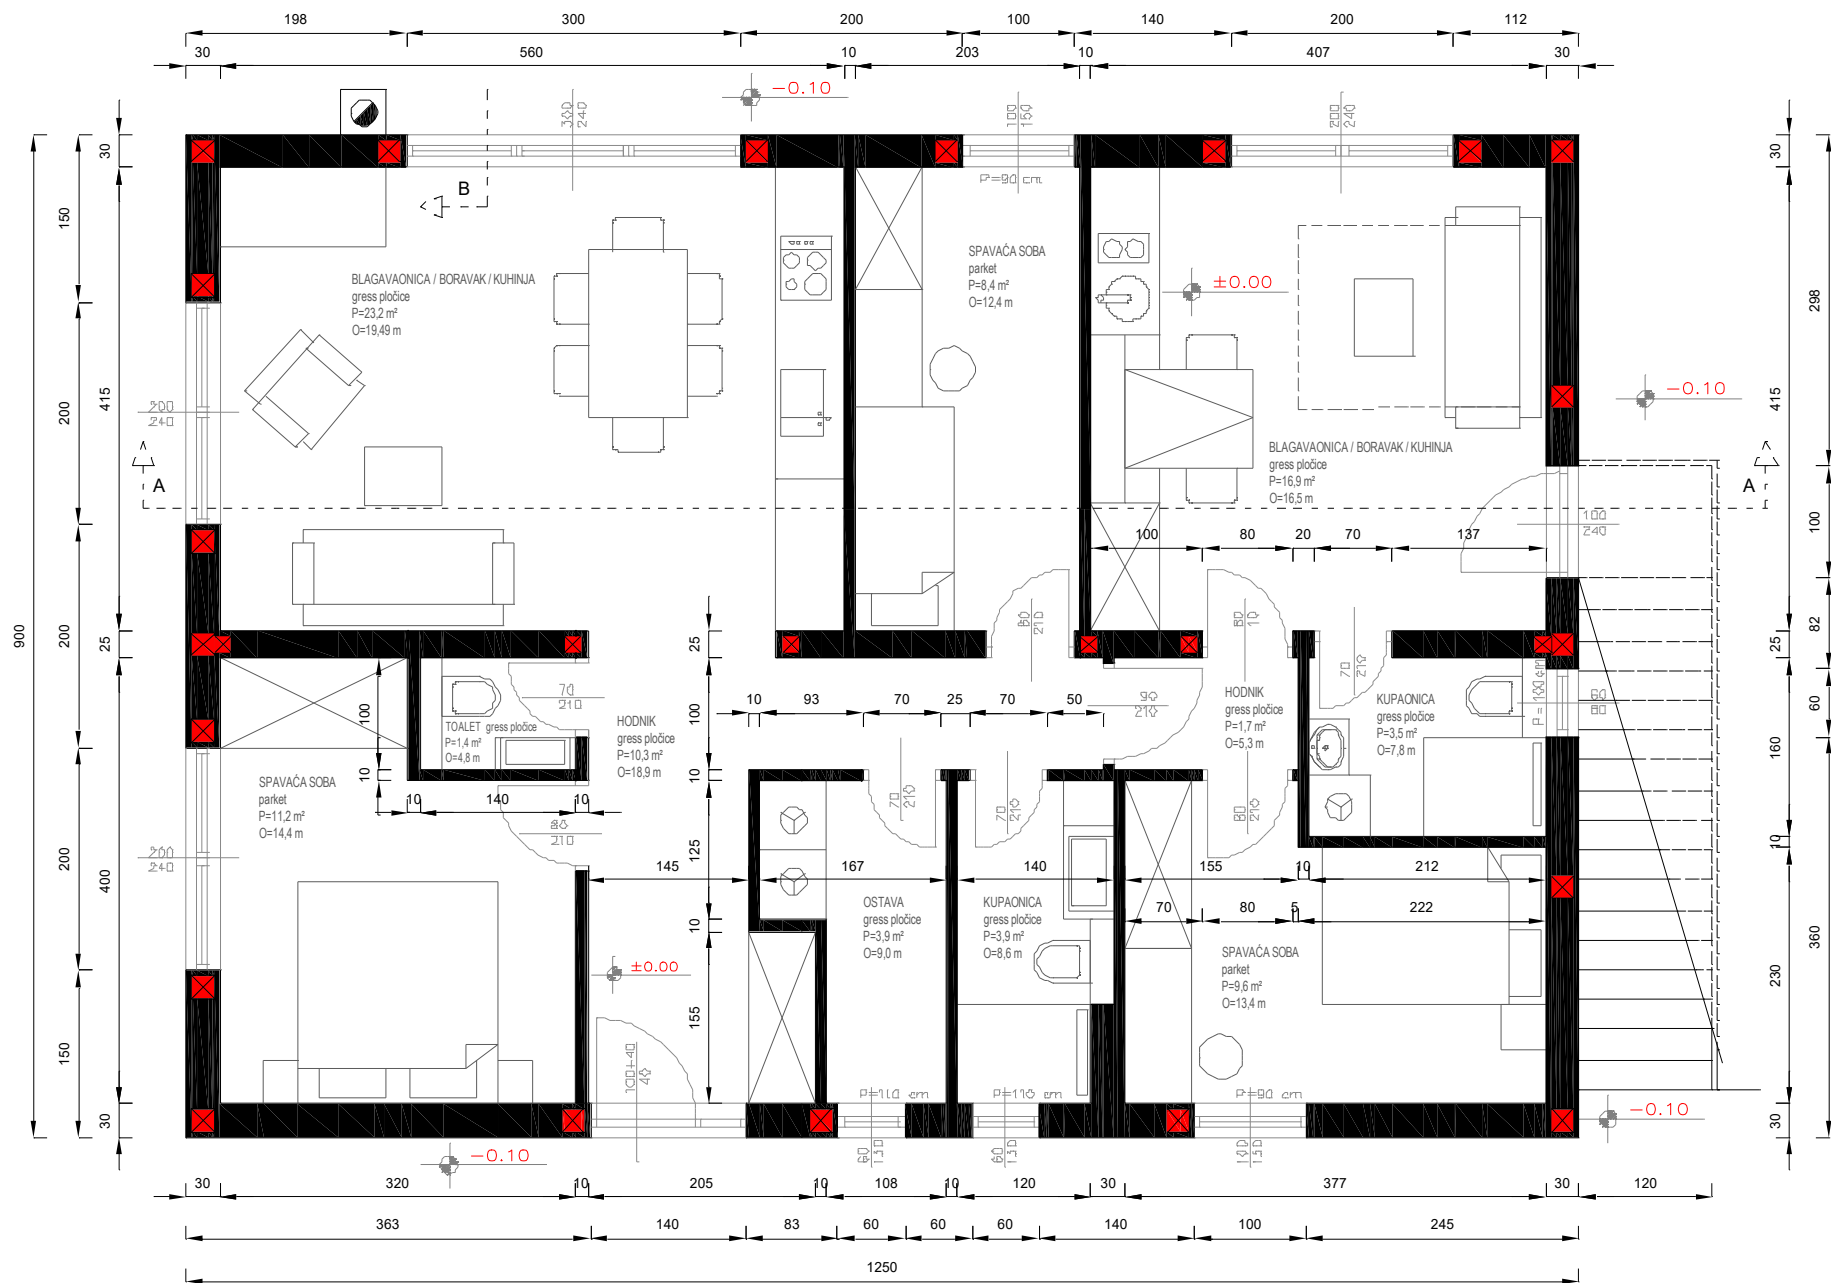

PRESJEK A-A

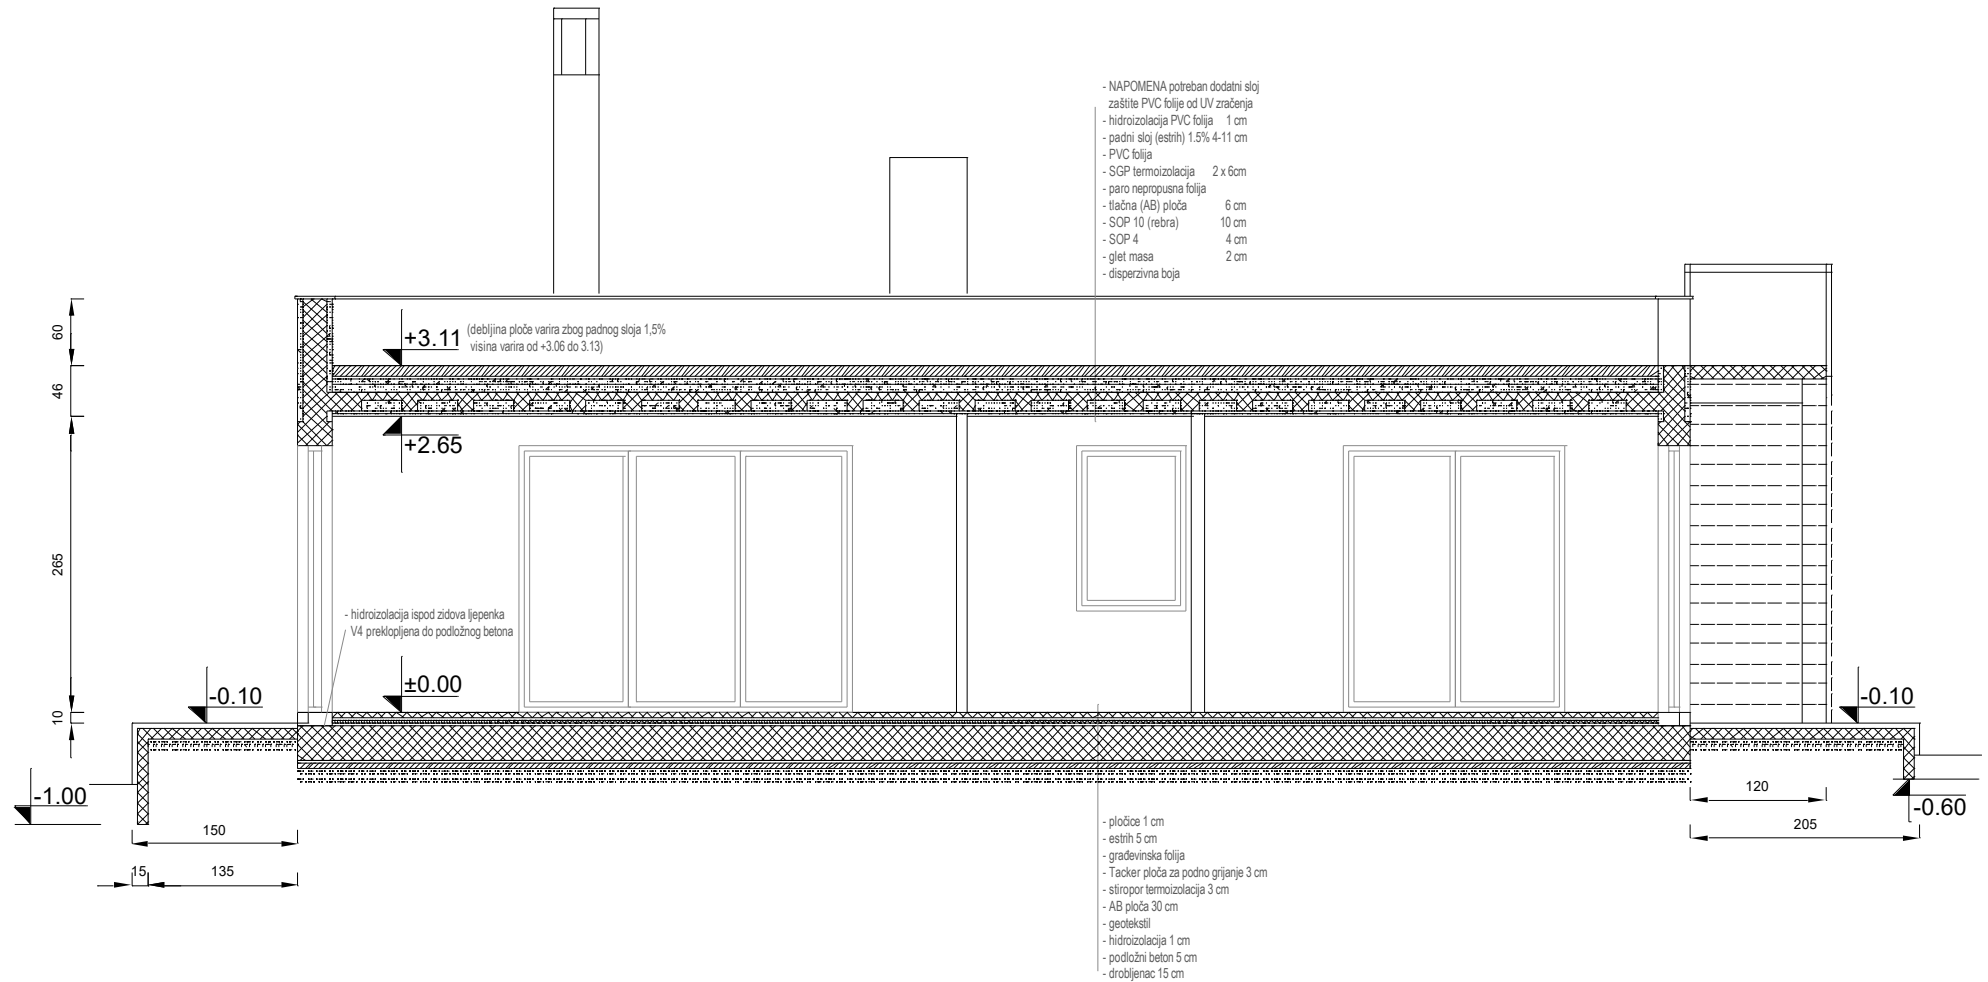

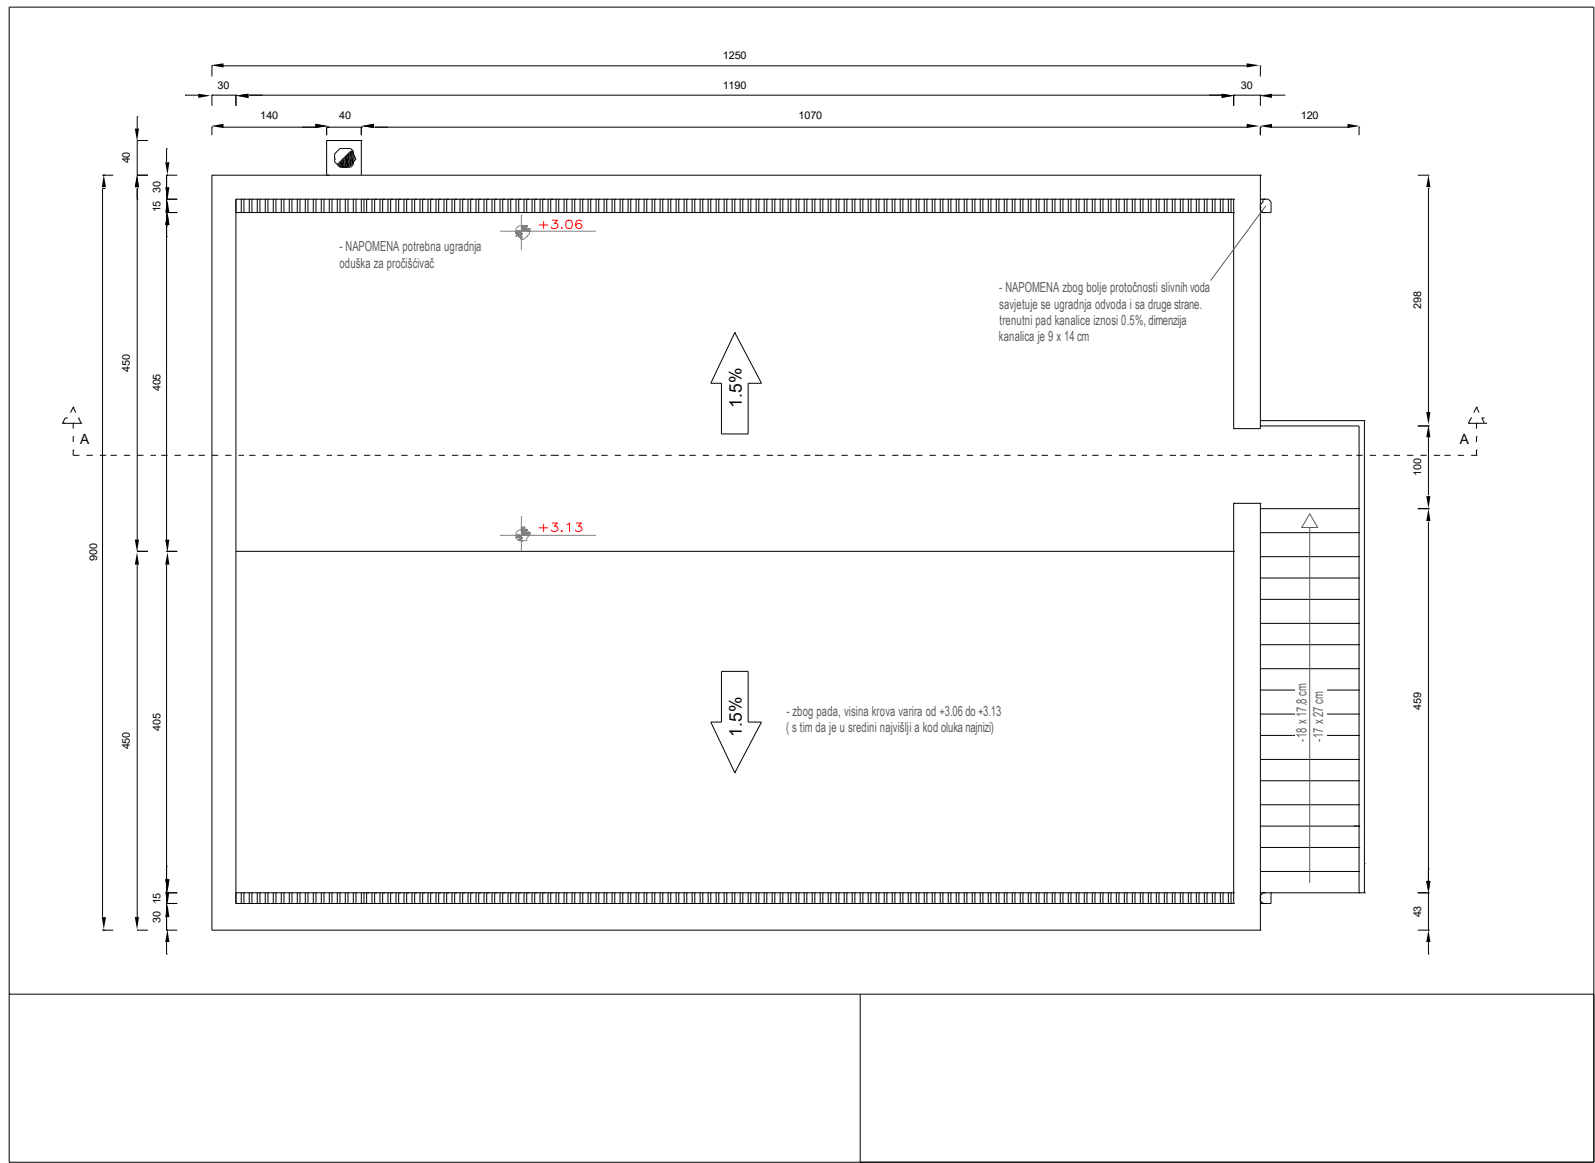

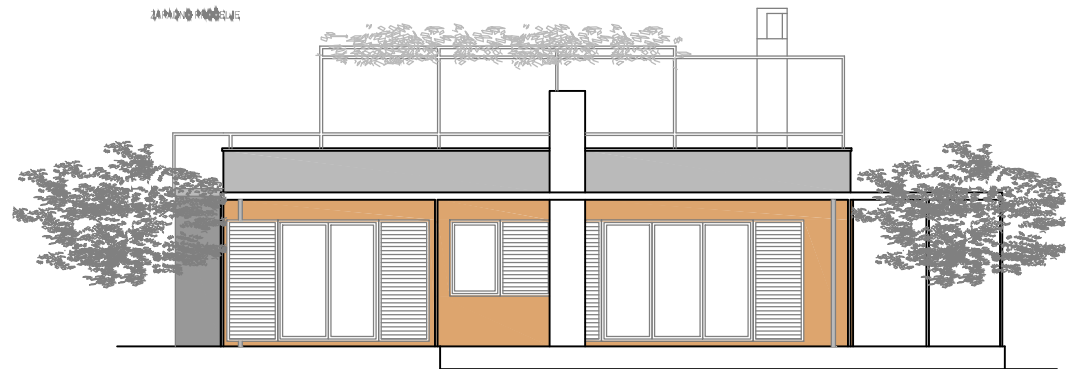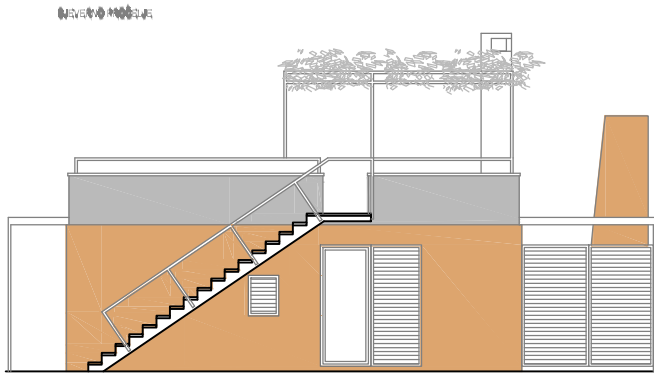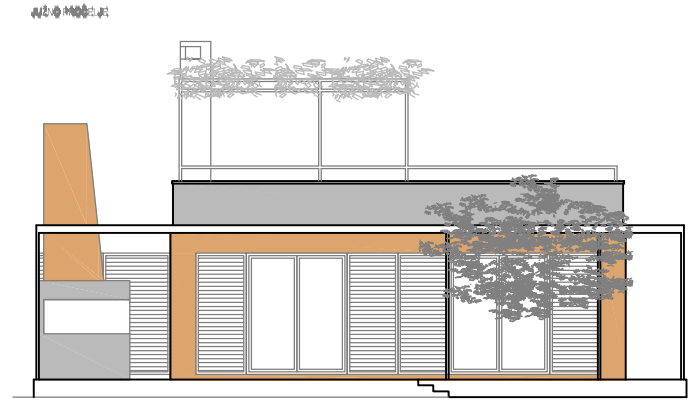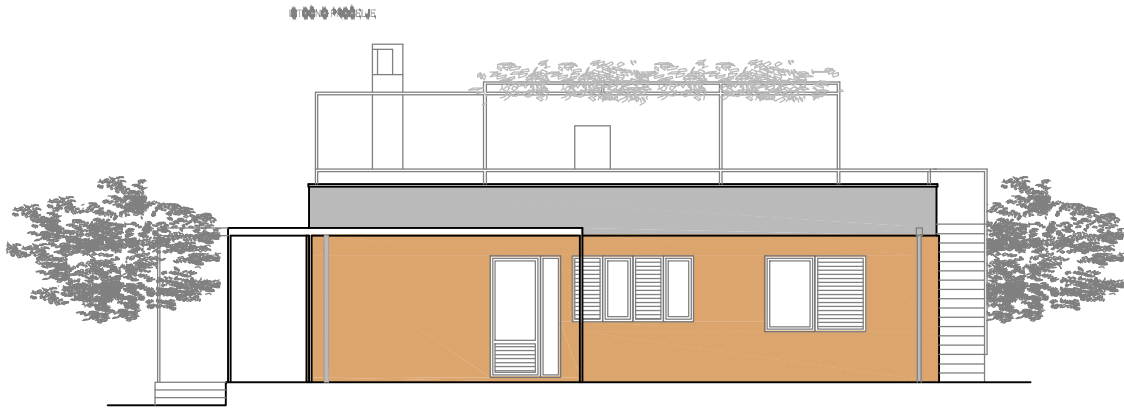

Stambena građevina, (Pr), k.č. broj 1172/3., k.o Komiža , Vis

Investitor

Slaven Kevo , OIB: 79635574592, Biševska 3,objekt Put Kamenica, KOMIŽA otok Vis

Izvođač

JADRIA MODUL j.d.o.o. , OIB: 10713534303, Novo Naselje 54. Gornji Karin

Građevna dozvola: Klasa: UP/I-361-03/18-01/000045
Urbroj: 2181/1-11-00- 09/01-19-0005

od 27.08.2019god. izvršna .20.09.2019. god. Izdana od Splitsko-dalmatinske županije Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis

3581 USL 011 Rad mini bagerom

Opis radova(obavezno):

Iskop temelja, vadenje i selidba maslina.

2318 7.12.2019. 196 Slaven Kevo

Gradilište je u redu.Vremenske prilike:

Temperatura zraka: 18 °C

Vlažnost zraka: 52 %

Vrijeme: Oblačno



9.12.2019.

196

Slaven Kevo



Opis radova(obavezno):

Početak iskopa parkinga s prilazne ceste sa južno istočne strane terena. Utovar i odvoz materijala na deponiju.



2529

24.1.2020.

196

Slaven Kevo

Gradilište je u redu. **Vremenske prilike:** Temperatura zraka: 11 °C Vlačnost zraka: 26 %

Vrijeme: Umjereno oblačno



Temperatura zraka: 14 °C Vlažnost zraka: 38 %

Vrijeme: Oblačno Utovar preostalog rasutog materijala od iskopa parkinga i odvoz na deponiju. Strojni iskop zemlje za temeljnu ploču kuće i.



otok

Gradilište je u redu. Vremenske prilike: Temperatura zraka: 14 °C Vlažnost zraka: 20 %

Vrijeme: Umjereno oblačno



List	3
Nadnevak upisa	srij
29.01.2020.	



List	3
Nadnevak upisa	četvrtak
30.01.2020.	

Planiranje podloznog terena za ploču sa drobljencom i tucanikom 16/32, nabijanje vibro pločom, dovoz alata i materijala na teren. Danas stigao kamion sa materijalom (armatura, drvo, izolacije, cement) iz Splita i istovaren na parkingu kod gradilišta. Potrebno prebaciti do terena jer kamion nije mogao prići bliže.



List	4
Nadnevak upisa	petak
31.01.2020.	

Gradilište je u redu. Vremenske prilike: Temperatura zraka: 0 °C Vlažnost zraka: 0 % Vrijeme:



List	6
Nadnevak upisa	pon
03.02.2020.	



List	7
Nadnevak upisa	utor.
04.02.2020.	

Gradilište je u redu. Vremenske prilike: Temperatura zraka: 9 °C Vlažnost zraka: 17 %
Vrijeme: Olujno





Impregniranje podloznog betona Recitolom, potom varenje Ljepenke V4 kao horizontalna hidroizolacija između podloznog betona i temeljne ploče. Ugradnja vanjskog ruba oplata prema iskolčenju i provjera vanjskog gabarita zgrada pomoću dijagonalne izmjere. Polaganje geotextila kao zaštite između armature i temelje hidroizolacije.

List	8
Nadnevak upisa	sri
05.02.2020.	

4128	ROH 041 Polaganje i ugradnja armaturne mreže jedne zone
4129	ROH 046 Povezivanje armaturne korpe do 10. šipki sa vilicama
4130	ROH 047 Ugradnja armaturne korpe u oplatu / temelj
4131	ROH 012 Izrada jednostrane oplata za AB ploče (vanjski rub okolo). U cijenu uključena izrada oplata i računa se debljina ploče (se

Polaganje geotekstila kao zaštitni sloj temeljne hidroizolacije. Ugradnja donje zone armaturne mreže prema glavnom projektu armaturnih korpi predhodno pripremljenih na gradilistu prema projektu konstrukcije. Dovrsetak salovanja vanjskog zuba temelj



List	10
Nadnevak upisa	petak
07.02.2020.	

Ugradnja temeljne odvodne instalacije prema projektu i izljevnim mjestima. Završne mufe fazonskih komada su ugrađene cca. 3-5cm niže ispod gornje kote temeljne ploče. Ugradnja gornje zone armaturne mreže.





List	10
Nadnevak upisa	petak
07.02.2020.	

Ugradnja betona, betoniranje temeljne ploče pomoću miksera. Prilikom ugradnje je beton održavan radi čekanja miksera iz betonare. U svaki mikser je ubačeno sredstvo Mapei radi vodonepropusnosti

betona - doziranje 1,5 lit. / 1m³ betona. Mapei preuzet od Betonare Mineri doo Zadar. Beton proizveden od strane kooperantske tvrtke Mario gradnja Vis, ugrađeno 34m³ betona marke 30.



8.2.2020.

Manje popravke na izbetoniranoj temeljnoj ploči. Zalijevanje ploče, održavanje betona. Čišćenje gradilišta i ograđivanje. Za cca. 10 dana planiran je početak zidanja.



Dovoz i istovar bagera, priprema i razmjeravanje za iskop jame za pročištač

List	12
Nadnevak upisa	pon
	24.02.2020

USL 011 Rad mini bagerom h 4.40

Iskop rupe za bio procistac, zapoceto kopanje kanala za bakrenu zicu i odvodnju.



26.2.2020.

214

Slaven Kevo

VOD 002 Stemanje kanala i proboja za cijevi (beton)

VOD 001 Trasiranje kanala za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i vani do mjesta priključenja, te obilježavanje trasa i izljevni mjesta. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Trase i izljevi uslikani uz prisustvo nadzora (navesti u napomeni). Obračun po izljevnom mjestu i trasi, odnosno tkzv. pravcu



27.2.2020.

List	22
Nadnevak upisa	čet.
05.03.2020.	

Iskop upojne jamice, ravnanje terena i utovar bagera.

Istovarili ručno 2 palete cementa, primimoć pri istovaru Simprolita 14 paleta.

Prebacivali i organizirali materijal na gradilištu.





List	24
Nadnevak upisa	utorak
10.03.2020.	

Izvedba hidroizolacije polimercementnim premazom GLETEROM 1-k ili 2-k masa. Nanosi se po uputi proizvođača. . U stavku je uključeno prethodna priprema i čišćenje podloge.
Hidroizolacija ispod nosivih zidova 2k polimercementni premaz u 3 sloja



List	25
Nadnevak upisa	srijeda
	11.03.2020.

Dana 11.03.2020.god. Počeli su radovi na izvedbi vanjskih konstruktivnih zidova prizemlja zgrade. Zidanje BLOK OPEKOM u+300/250/238 prvi red .

Ugradnja betona u oplatu sa tla bez dizanja ručno, miješanje mješalicom za beton.

Usluge rada inženjera po satu koje se obračunavaju .



List	26.
Nadnevak upisa	četvrtak
	12.3.2020

Iskop terena (ispod), zasipanje cijevi. Zidanje simprolit blokom te ispuna betonom i horizontalno armiranje istog. Investitor je zatražio da se zidarski otvor izlaza iz kuhinje na terasu smanji sa 300 na 260 cm, potvrđeno od voditelja gradilista.



List	28
Nadnevak upisa	subota
	14.3.2020

ROH 090 Zidanje pregradnih zidova SIMPROLIT BLOKOM

ROH 037 Ugradnja armaturne šipke za ukrutu.

ROH 048 Rezanje ankera / armaturne šipke

ROH 049 Bušenje i ugradnja veznih ankera / arm. šipke u beton

ROH 074 Ugradnja betona u oplatu sa tla bez dizanja ručno, miješanje mješalicom za beton.

Hidroizolacija pregradnih zidova, razmjeravanje za zidanje pregradnih zidova. Zidanje srednjeg zida blokom vertikalno armiranje, te popunjavanje betonom Siprolit zida. Prilikom razmjeravanja pregradnih zidova koja je predviđena za vertikalnu vezu, odnosno jednu od ozraka fi 110 pogresno ugrađena. Pored mogućnosti kako bi bilo moguće izvesti vertikalnu trasu, međutim investitor je rekao da se zablindira cepom te da se neće u prilogu. Lokacija cijevi na malom zidu između master spavace sobe i wc-a.





Zidanje zida 4m², ugradnja vodovodni sahti, salovanje i armiranje za sahte. Betoniranje sahti





List	31
Nadnevak upisa	srijeda
18.03.2020.	

List	32
Nadnevak upisa	čtv.
19.03.2020.	

Zidanje Simprolit nosivog zida od 30cm. Armiranje i betoniranje Simprolit zidova. Salovanje i armiranje nadvoja. Salovanje i armiranje vertikalnih serklaza u Simprolit bloku.


	ROH 007 Izrada trostrane oplata za AB grede - glatka. U cijenu uključena samo izrada oplata sa postavom podupirača - KVADRATURA BETONA
	ROH 037 Ugradnja armaturne šipke za ukrutu.
	ROH 076 Ugradnja betona u oplatu sa skele ručno pomoću kante i dizalice te ručno miješanje mješalicom

List	32
Nadnevak upisa	petak
20.03.2020.	

Zidanje vanjskog zida Simprolit blokom 30cm. Izrada oplata za nadvoje i prozore. Armiranje i ugradnja betona u Simprolit blok





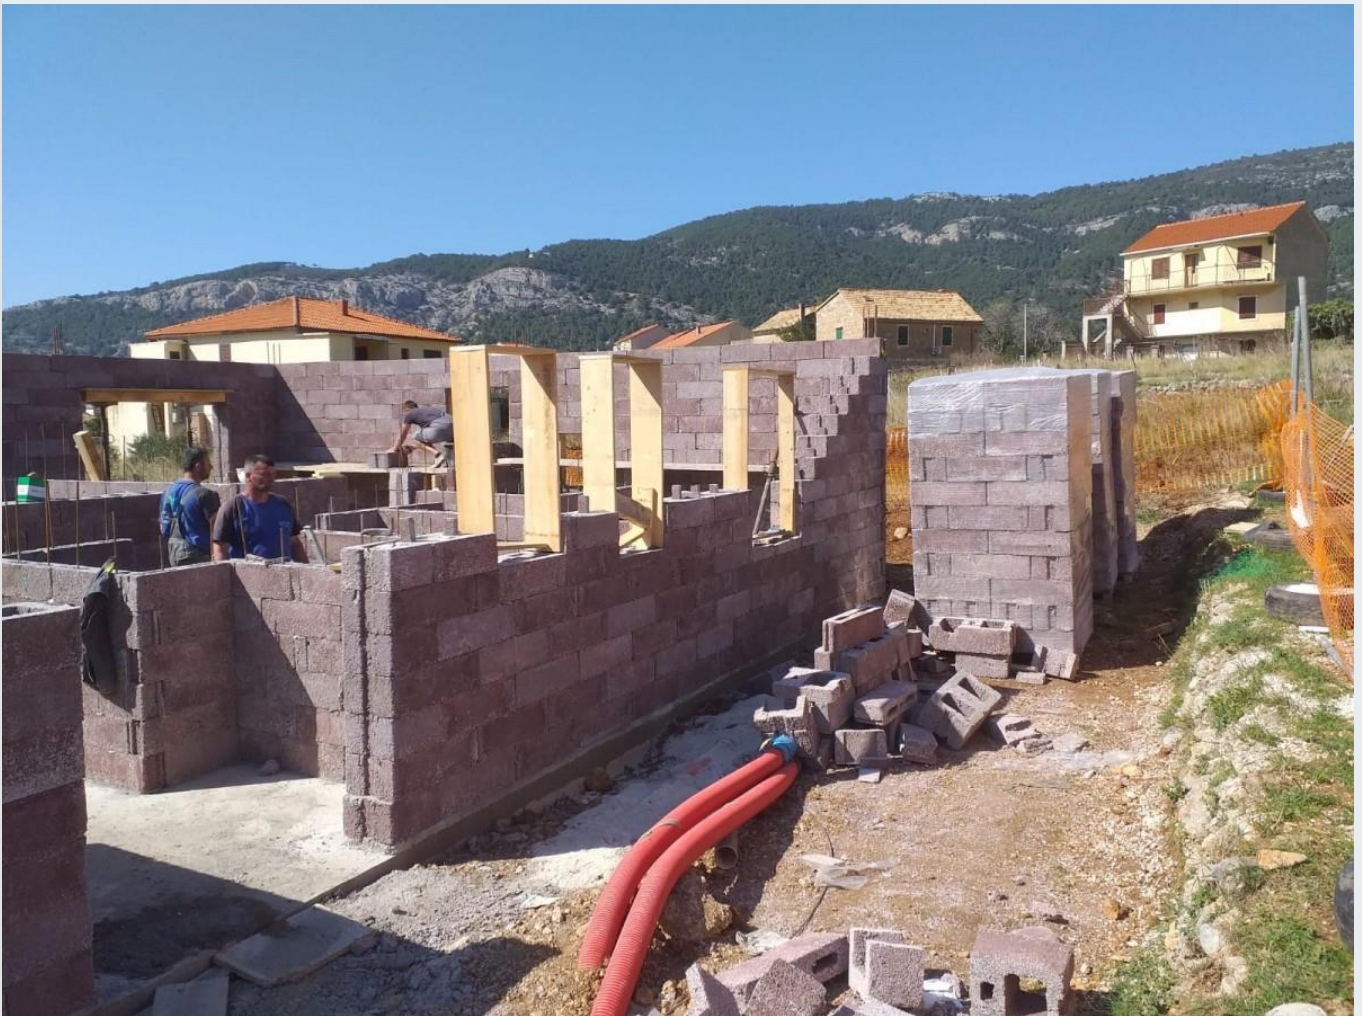



List	33
Nadnevak upisa	sub.
21.03.2020.	

Zidanje srednjeg nosivog Simprolit zida, vezanje armaturnih korpi i armiranje stupova. Salovanje Simprolit nadvoja vertikalne serklaze.





List	34
Nadnevak upisa	nedjelja
22.03.2020.	

Zidanje pregradnog zida Simprolit blokom. Armiranje i punjenje betonom. Ručni iskop pored bio pročistača radi ugradnje instalacija za odvod i spajanje ozrake.



List	35
Nadnevak upisa	pon
23.03.2020.	





List	36
Nadnevak upisa	utor.
24.03.2020.	

Ugradnja podložnog betona, radi šalovanja žardonjere za cvijeće. Šalovanje staze jednostranom oplatom, ugradnja armaturne mreže. Hidroizolacija zida i temeljne ploče - vanjskog spoja (polimerno cementna, armirana mrežicom). Ugradnja betona i fino zaglađivanje na stazi oko kuće.





List	37
Nadnevak upisa	srijeda
26.3.2020	

Priprema podloge za produživanje terase / staze na širinu 205cm, ugradnja ankera u postojeći beton, šalovanje vanjske oplate. Izrada dvostrane oplate za nadtemeljne zidove velike terase za zardonjeru.



28.03. ZASTOJ RADOVA ZBOG ODLUKE KRIŽNOG STOŽERA VISA ZA ZABRANU TRANSPORT MATERIJALA
SPLIT -VIS



List	50
Nadnevak upisa	utorak
28.04.2020.	

Šalovanje ploče za Simprolit međukatnu ploču, ugradnja SMP donje ploče, ocrtavanja za ugradnju rebara





List	51
Nadnevak upisa	srijeda
29.04.2020.	

ROH 005 Izrada oplate za AB ploču - glatka. U cijenu uključena izrada oplate sa postavom gredica i podupirača m234.00


5808 ZAV 078 Polaganje stiropora za izradu estriha m23.00

5809 ROH 045 Povezivanje armaturne korpe do 4. šipke sa vilicama m142.00

5810 ROH 038 Ugradnja armaturne korpe za AB gredu / horizontalno serklaž djelimično pripremljene (75%) i ugradnja dodatne šipke i povezivanje

Završetak šalovanja poda za SMP ploču, polaganje donje zone ploče i ugradnja Simprolit rebara za SMP ploču pomoću fleksibilnog ljepila na donju ploču. Povezivanje armaturnih koševa i ugradnja istih u SMP ploču.



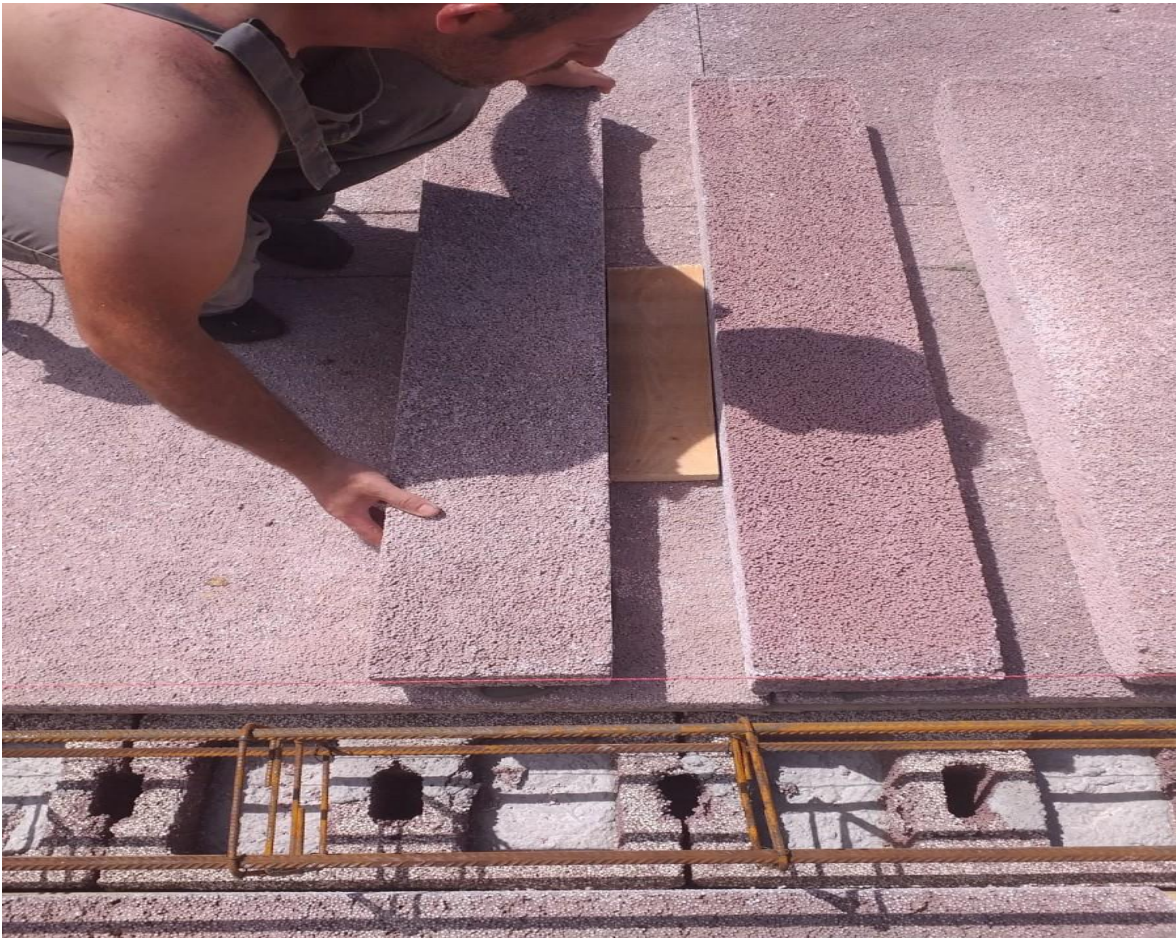





List	52
Nadnevak upisa	četvrtak
30.04.2020.	

- ZAV 078 Polaganje stiropora za izradu estriha m2 60.00
5812 FAS 004 Ljepljenje fasadnog stiropora/stirodura pomoću EPS ljepila/malte sivem220.00
5813 ROH 045 Povezivanje armaturne korpe do 4. šipke sa vilicama m138.00
5814 ROH 037 Ugradnja armaturne šipke za ukrutu. m160.00
5815 ROH 038 Ugradnja armaturne korpe za AB gredu / horizontalno serklaž djelimično pripremljene (75%) i ugradnja dodatne šipke i povezivanje m118.00
5816 ROH 047 Ugradnja armaturne korpe u oplatu / temeljm1220.00
Ugradnja SMP rebara pomoću fleksibilnog ljepila na donju Simprolit ploču. Ugradnja armaturnih koševa i rešetkastih nosača, te ukrutnih greda armature. Pripremljeno za polaganje armaturne mreže nakon razvoda kableske instalacije i ventilacije kroz strop.





List	53
Nadnevak upisa	subota
02.05.2020.	

ROH 008 Izrada četverostrane oplata za AB stupove - glatka. U cijenu uključena samo izrada oplata - KVADRATURA BETONA m2 3.00

5833 ROH 007 Izrada trostrane oplata za AB grede - glatka. U cijenu uključena samo izrada oplata sa postavom gredica i podupirača - KVADRATURA BETONA m2 1.00

5834 ROH 005 Izrada oplata za AB ploču - glatka. U cijenu uključena izrada oplata sa postavom gredica i podupirača m2 1.20

5835 ROH 014 Izrada oplata za AB stubište ravno/podesti/U i L stubište. U cijenu uključena montaža oplata poda. m2 6.00

5837 ROH 012 Izrada jednostrane oplata za AB ploče (vanjski rub okolo). U cijenu uključena izrada oplata i računa se debljina ploče (serklaža ili betona) puta dužina što iznosi ukupnu kvadraturu m2 2.40

5838 ROH 045 Povezivanje armaturne korpe do 4. šipke sa vilicama m1 5.00

5839 ROH 047 Ugradnja armaturne korpe u oplatu / temelj m1 8.00

5840 ROH 048 Rezanje ankera / armaturne šipke kom 11.00

5841 ROH 076 Ugradnja betona u oplatu sa skele ručno pomoću kante i dizalice te ručno miješanje mješalicom za beton m3 1.00


Šalovanje stupa za stepenice, armiranje i betoniranje. Šalovanje podesta i podnice stepenica, dovoz dodatnih podupirača. Preostalo još par sati pripreme za betoniranje AB ploče is stepenica, plan je u ponedjeljak ugradnja betona pomoću miksera i pumpe ukupno 17m3. Potrebno pripremiti 2 kocke za kontrolu betona 20x20x20cm









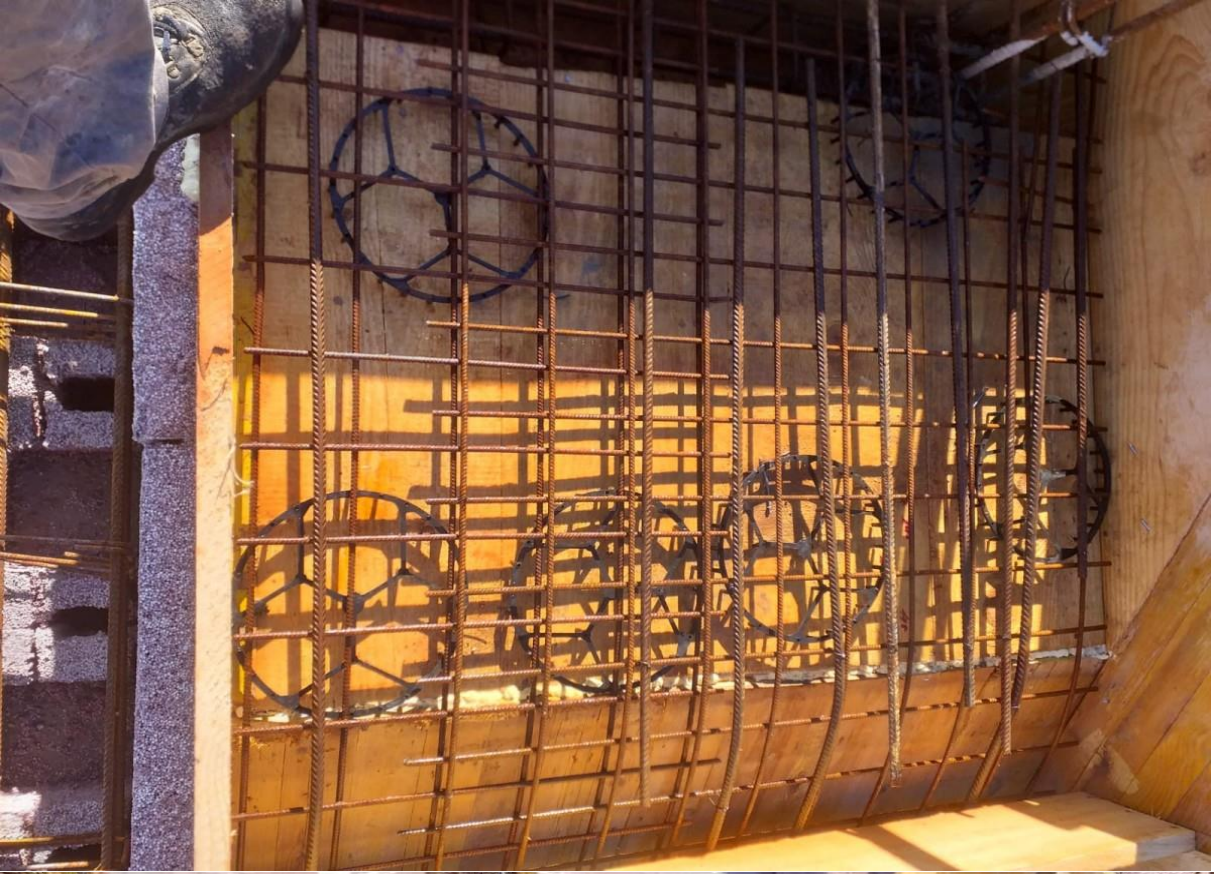




List	54
Nadnevak upisa	ponedjeljak
04.05.2020.	

ROH 067 Betoniranje betonske ploče/deke, strojna ugradnja betona pomoću miksera i betonske pumpe,

- ROH 075 Ugradnja betona u oplatu sa skele strojno pomoću miksera te transport kranom i betonskom kiblom.
- 5864 ROH 073 Ugradnja betona u oplatu sa tla bez dizanja strojno pomoću miksera i pumpe.
- 5865 ROH 042 Ručno dizanje ili pomoću krana / prenošenje jedne mreže preko 6m² / armaturne korpe preko 300cm dužine na na 1 zonu visine (dizanje na 1 kat). Svaki kat se dodatno zaračunava.
- 5866 ROH 041 Polaganje i ugradnja armaturne mreže jedne zone
Polaganje i vezanje armaturnih mreza nakon rucnog dizanja na ploču.
pumpe. Ukupno u ploču i stepenice ugradjeno 19m³ betona. Uzeta proba betona u 3 kočke

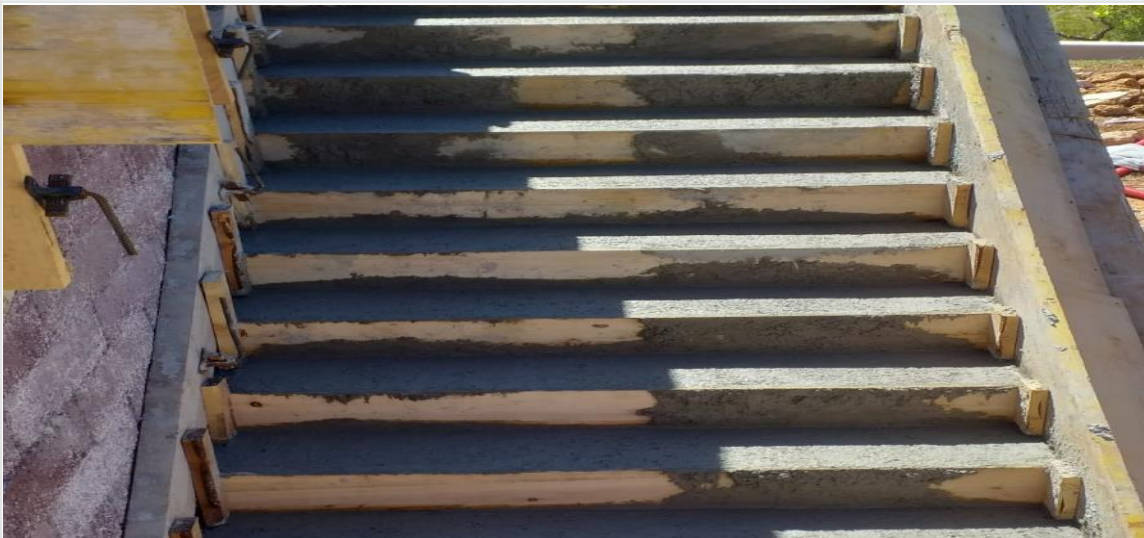



List	55
Nadnevak upisa	utorak
05.05.2020.	

Manje popravke na izbetoniranoj temeljnoj ploči. Zalijevanje ploče, održavanje betona.

List	56
Nadnevak upisa	srijeda
06.05.2020.	

ROH 037 Ugradnja armaturne šipke za ukrotu.

5932 ROH 087 Zidanje SIMPROLIT BLOKOM ATIKE zida









List	61
Nadnevak upisa	ned
12.05.2020.	



List	61
Nadnevak upisa	Ned.
12.05.2020.	

Početak zidanja Schiedel dimnjaka fi 200, zidanje ogradnog zida siporeksom na podestu stepenica.
Šalovanje i armiranje zidova obostranom oplatom vanjskih stepenica i staze na terenu






List	64
Nadnevak upisa	sub.
16.05.2020.	



List	69
Nadnevak upisa	srijeda
27.05.2020.	

Ciscenje ab ploc / ravnog krovae i postavljanje privremene hidroizolacije pomocu ljepila i mrezice. Ugradnja holkera uz rub sa mrezicom radi hidroizolacije ruba zida

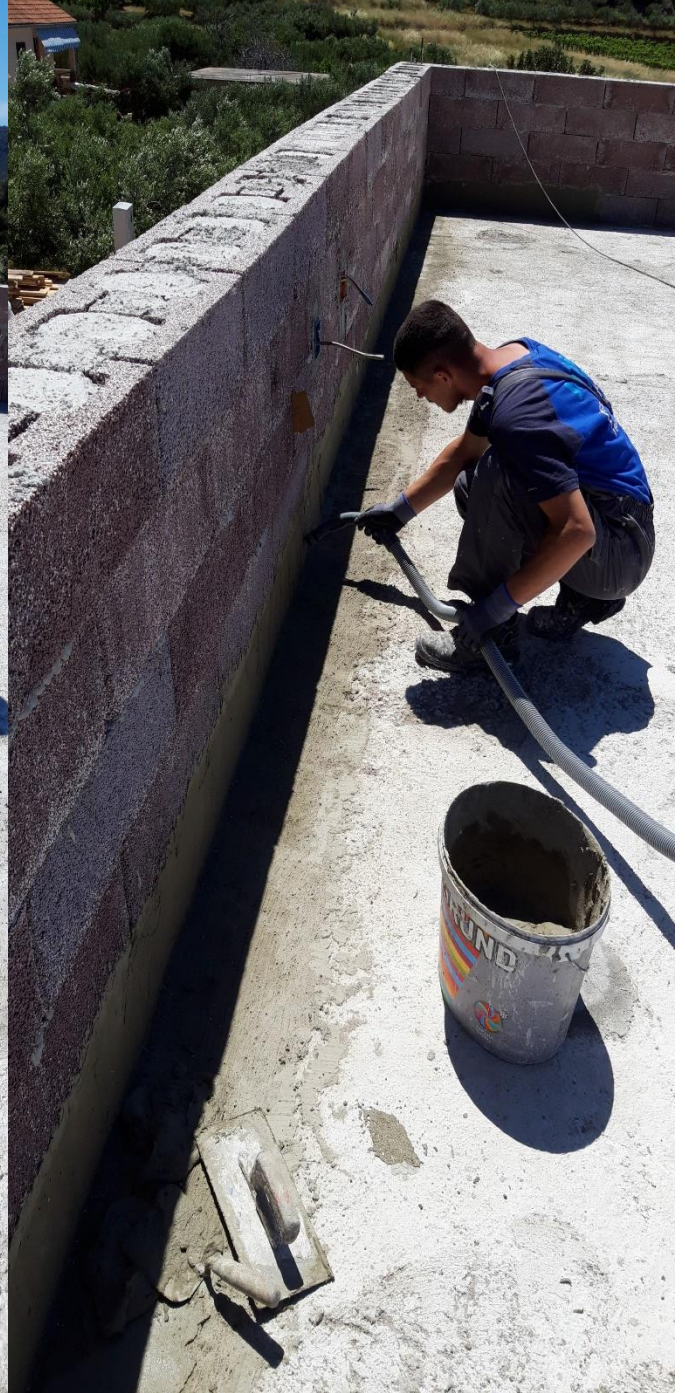



List	70
Nadnevak upisa	čet.
28.05.2020.	


Drugi sloj holkerske hidroizolacije i izolacije ravnog krova - privremena hidroizolacija dok se ne napravi padni beton na krovu. Danas utovaren kamion sute i odvezeno na deponiju



List	71.
Nadnevak upisa	pet
29.05.2020.	

Ugradnja betona ispod podstoka vanjske stolarije, radi stabilizacije. Priprema 4 preljevne cijevi na ravnom krovu radi privremene odvodnje s krova. Ciscenje gradilista.



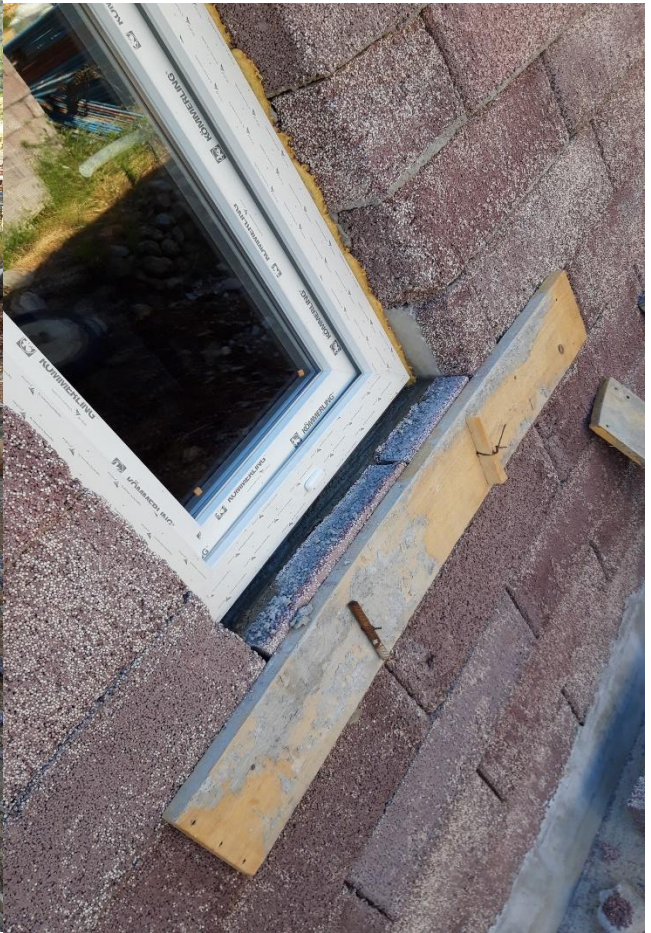

List	72
Nadnevak upisa	sub.
30.05.2020.	

FAS 001 Postavljanje / montaža fasadne skele






List	73
Nadnevak upisa	nedj.
31.05.2020.	

Drugi sloj privremene hidroizolacije ravnog krova, postavljanje fasadne skele. Brušenje Simprolit zida / neravnina. Zidanje dimnjaka i kanala uz dimnjak za ozraku Siporeksom. Vodoinstalater Ivo i Agron zaštićivali vodovodne i odvodne instalacije na podu betonom.



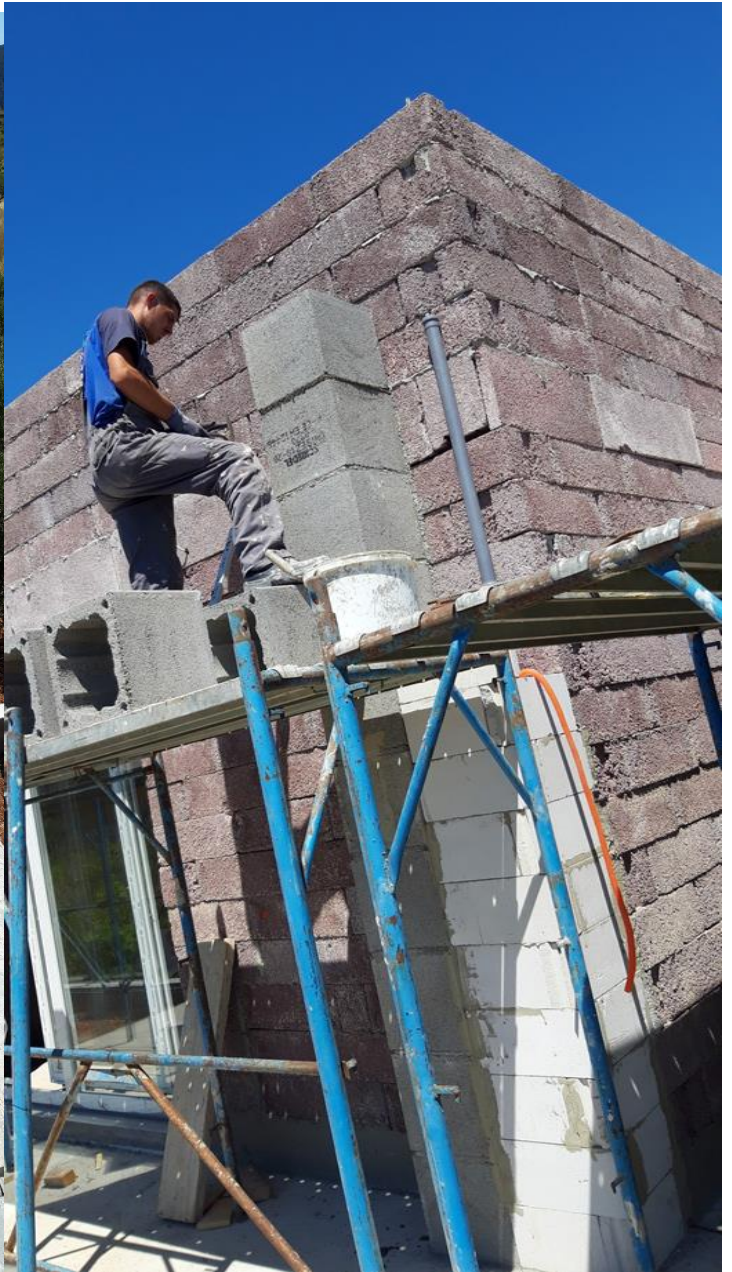

List	74
Nadnevak upisa	pon.
01.06.2020.	

Šalovanje, armiranje i betoniranje betonske kape na zidu atike 13m1. Brušenje vanjskih zidova







List	76
Nadnevak upisa	srij
03.06.2020.	

Demontaža oplata na betonskoj kapi zida atike, Zidanje kanala uz dimnjak Siporeksom, zidanje zida Siporeksom na podestu. Šalovanje, armiranje i betoniranje AB kape.





List	79
Nadnevak upisa	ut
09.06.2020.	

postavljanje alu kutnih profila za zbuku 15 metr gruba obrada spaleta 16 metr pvc kutnog profila 6.55 metr
brusenje Simprolit zida 96 kvadrata betona ispod pod stoka vanjske stolarije, radi stabilizacije.



List	82..
Nadnevak upisa	sub
13.06.2020.	

brusenje 53 kvadrata zida unutra, ugradanja fasadnog pvc spaletnog profila sa mrezicom 30 duznih metara, postavljajne alu kutnih profila za zbuku 30 duznih metara





List	84
Nadnevak upisa	pon
15.06.2020.	


Postavljanje alu kutnih profila za strojnu zuku unutra, popunjavanje instalacijskih kanala od cijevi i kablova sa zbukom.





List	85
Nadnevak upisa	utor.
16.06.2020.	

Ugradnja alu kutnih profila za zbuku 60 duzna metra, gruba obrada spaleta 4 duzina metra, fasadnog pvc spaletnog profila s mrezicom (ab lajsne) 10 duznih metara

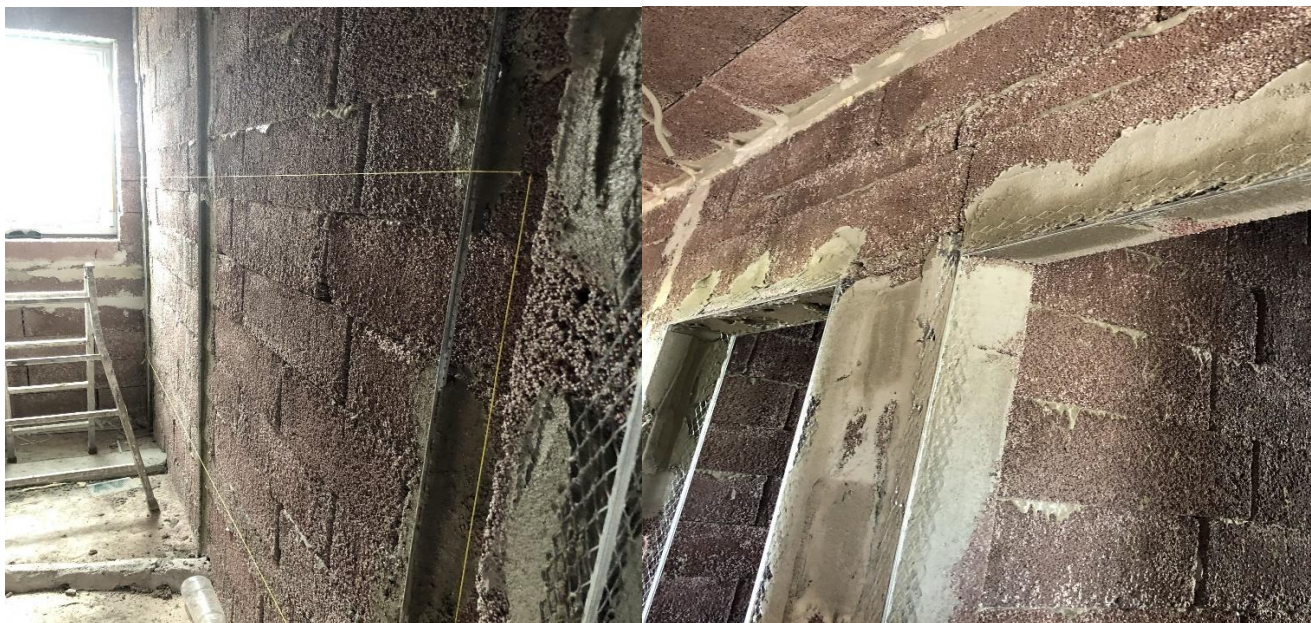





List	87.
Nadnevak upisa	čet.
18.06.2020.	





ZAV 053 Grubo žbukanje zidova







List	90
Nadnevak upisa	pon.
22.06.2020.	



Obrada zidova atike iznutra ljepilom i mrežicom, ugradnja odvodnih kanalica za kišnicu



Obrada zidova atike iznutra ljepljom i mrežicom, ugradnja odvodnih kanalisa za kišnicu



List	94
Nadnevak upisa	pet
26.06.2020.	

Priprema podloge za hidroizolaciju, nanos 2-k polimerno cementne hidroizolacije na podovima kao dodatna blokada protiv kapilarne vlage. Polaganje stiropora na pod za estrih.







List	95
Nadnevak upisa	sub
27.06.2020.	

Izrada betonskih poklopaca na vanjskoj terasi, ugradnja vratašca za dimnjak. Obrada zidova atike ljepilom.





List	95
Nadnevak upisa	sub

Izrada hidroizolacije podova. Postavljanke stiropora za glazuru



List	100
Nadnevak upisa	čet.
02.07.2020.	

Žbukanje fasade grubo, brušenje zidova fasade. Ugradnja betona ispod ulaznih vrata. Čišćenje okoliša i utovar šute, preslagivanje i deponiranje materijala. Utovar i odvoz materijala na deponiju







List	102
Nadnevak upisa	sub.
04.07.	

ROH 166 Utovar ili istovar alata / opreme OPIS U NAPOMENI

7099 ZAV 053 Grubo žbukanje zidova

Dolazak na Vis, ravnanje susjednog terena zemljom, nasipanje i ravnanje terena sa materijalom 16-32.









List	104
Nadnevak upisa	pon
07.07.2020.	

Ugradnja fasadnog pvc okapnog profila s mrežicom 9.61 dužina metar ugradnja fasadnog pvc kutnog profila s mrežicom 14.75 dužina metar.



List	107
Nadnevak upisa	pet
10.07.2020.	

Ugradnja okapnog profila i obrada AB kape. Gruba obrada špaleta i grubo žbukanje na vanjskim zidnim površinama.





List	108
Nadnevak upisa	sub
11.07.2020.	

Ugradnja prozorskih klupcica uz djelomicno prethodno stemanje lezista. Ugradnja estriha ispod sirih klupcica na ulaznim i balkonskim vratima. Utovar i istovar materijala. Utovar otpada i odvoz.



List	109
Nadnevak upisa	pon
13.07.2020.	

Utapanje mrezice i izravnanje površine 40 kvadrata, gruba obrada spaleta, Ugradnja prozorskih klupcica na balkonskim vratima. Izrada fine žbuke stropa




List	110
Nadnevak upisa	ut
14.07.2020.	
Temperatura gradiva	

Filcanje Špaleta 13 duzina metar Filcanje zidova 76.50 kvadrati čišćenje prozora



List	111
Nadnevak upisa	sr
15.07.2020.	

ZAV 057 Fino žbukanje zidova uključeni otvori u m2 - 1 ruka m2 25.00
7386 ZAV 059 Filcanje zidova nakon fine žbuke uključeni otvori u m2 25.00
7387 ZAV 017 Postavljanje alu kutnika na KNAUF / RIGIPS zidove i stropove

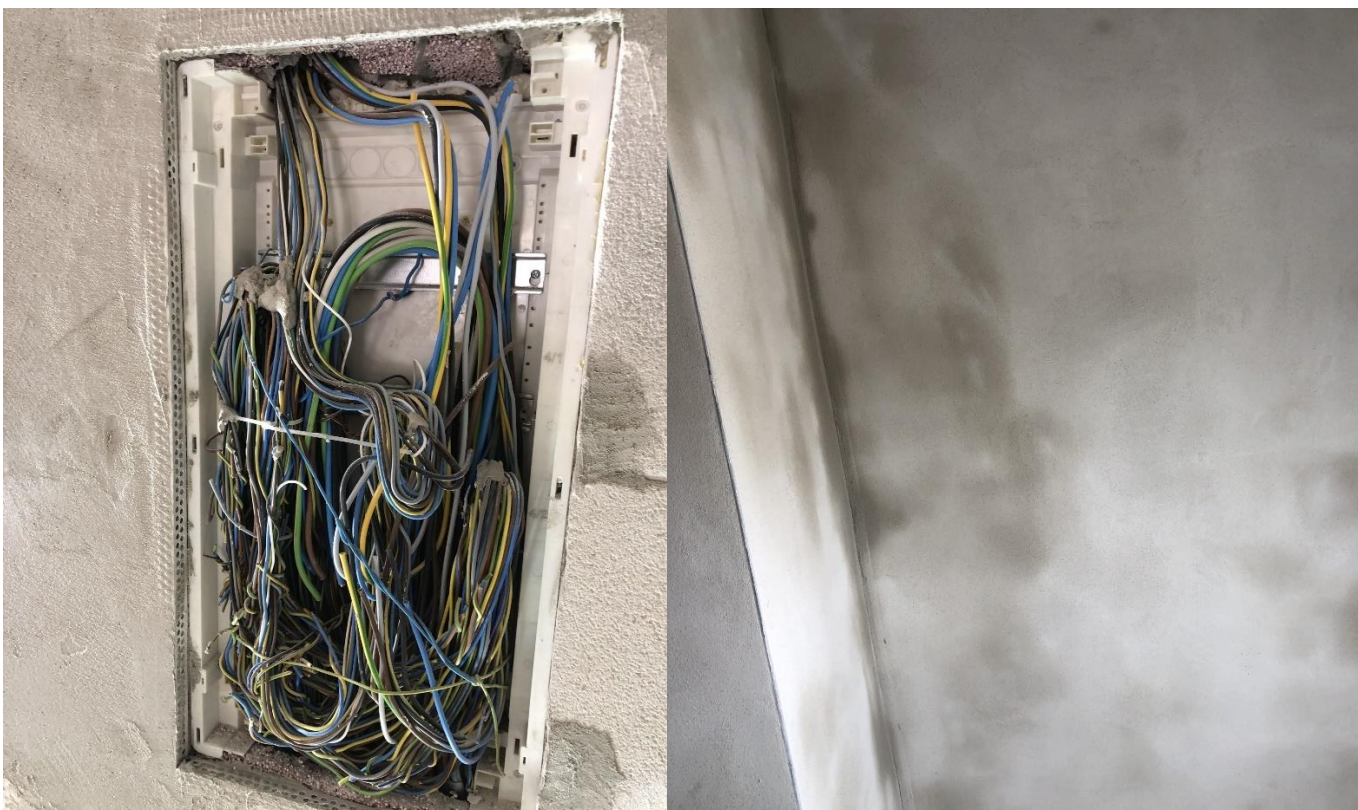

List	112
Nadnevak upisa	čet
16.07.2020.	

AS 009 Ugradnja fasadnog PVC okapnog profila s mrežicom m1 2.80
7405 ZAV 062 Postavljanje alu kutnih profila za finu žbuku i gletanje m1 3.60
7406 ZAV 055 Žbukanje, gruba obrada špaleta m1 3.60





List	114
Nadnevnik upisa	sub.
18.07.2020.	

7459	ZAV 059 Filcanje zidova nakon fine žbuke uključeni otvori u m2	m2	56.00
7460	ZAV 057 Fino žbukanje zidova uključeni otvori u m2 - 1 ruka	m2	56.00
7461	ZAV 055 Žbukanje, gruba obrada špaleta	m1	8.00
7462	ZAV 063 Fina obrada špaleta nakon ugradnje kutnih profila - gletana ili filcana žbuka	m1	3.60



List	115
Nadnevak upisa	pon
20.07.2020.	

7493	FAS 011 Nanos temeljne fasadne žbuke/ljepila, utapanje mrežice i izravnavanje površine	m2	41.60
7494	ZAV 059 Filcanje zidova nakon fine žbuke uključeni otvori u m2	m2	11.75
7495	ZAV 057 Fino žbukanje zidova uključeni otvori u m2 - 1 ruka	m2	11.75



List	120
Nadnevak upisa	ned
26.07.2020.	

Nanos završne fasadne zbuke po izboru investitora, proizvođač Samoborka Terakril 1.5






List	121
Nadnevak upisa	pon
27.07.2020.	

7657 FAS 015 Demontaža fasadne skele m2 92.00

7658 FAS 014 Nanos završne fasadne žbuke granulacije 1,5 ili 2,0 i zaribavanje m2 6.70



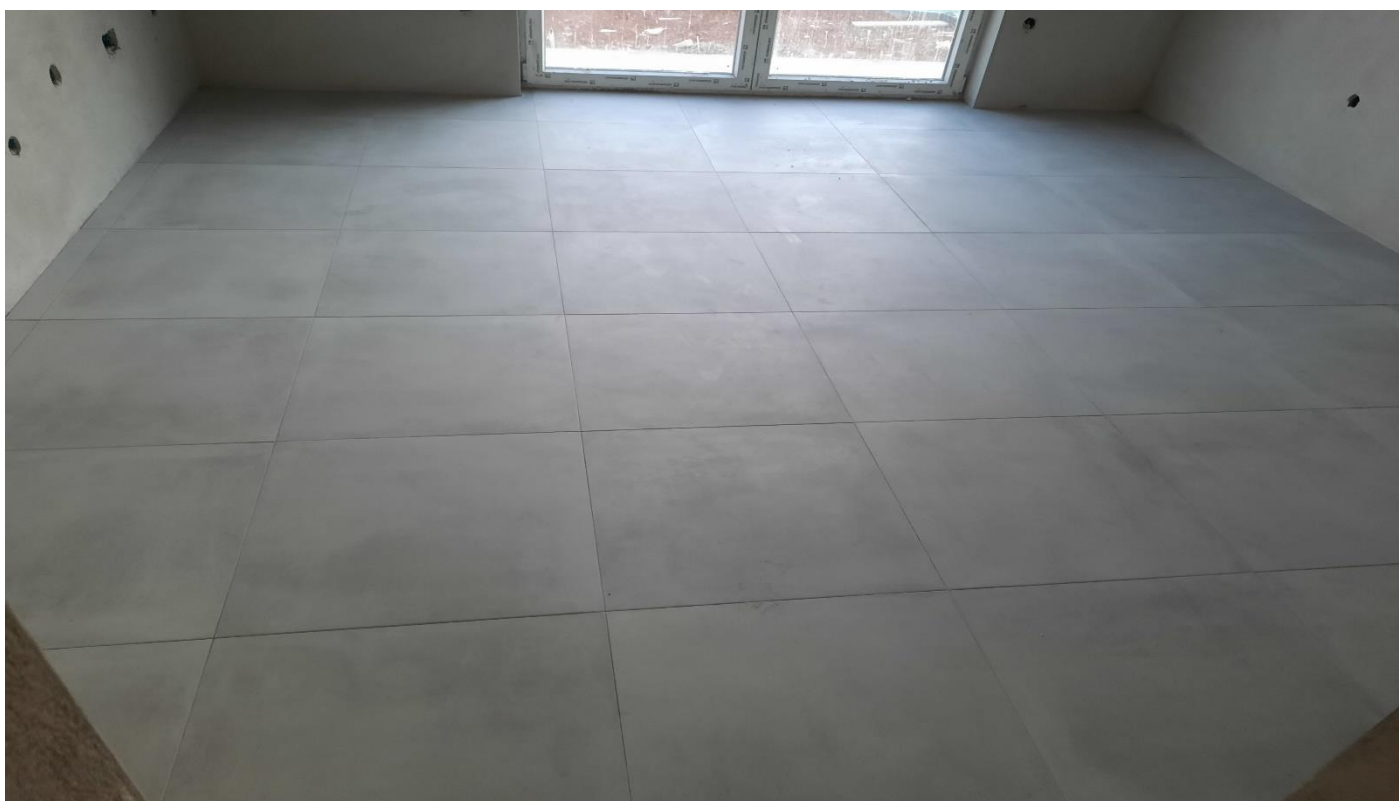



List	122
Nadnevak upisa	ut
	28.07.2020.

1 vodi
1 telj
1 rad
1 nika
1 zida
1 ra

Hidroizolacija ravnog krova / terase, utovar alata. Čišćenje fuga i fugiranje keramičkih pločica. Pripomoć pri izradi i završetku hidroizolacije na ravnom krovu / terasi. Čišćenje gradilišta i utovar šute te odvoz na deponiju. Utovar alata i opreme radi odvoza u skladište tvrtke



List	123
Nadnevak upisa	pet
31.07.2020.	

Ljepljenje keramike veliko kupatilo

List	124-129
Nadnevak upisa	sub-pet.
01.08.-07.08.2020.	

1 vodi
1 telj
1 ker
1 ami

Postavljanje 3 štoka velike alu grilje preklopne i 1 male grile sa komarnikom
čišćenje prostora u kući i pakovanje alata



07.08.2020. Završeni su radovi na izgradnji stambene zgrade i uređenje okoliša
