



**Raspored ab vertikalnih serklaža**


**Prizemlje**

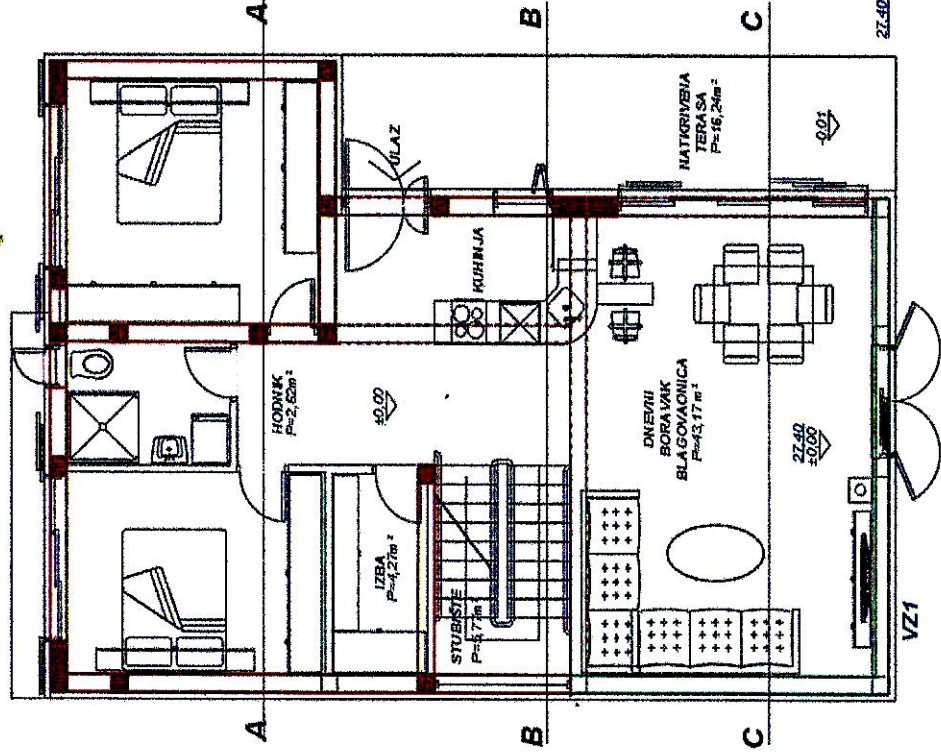

**Kat**

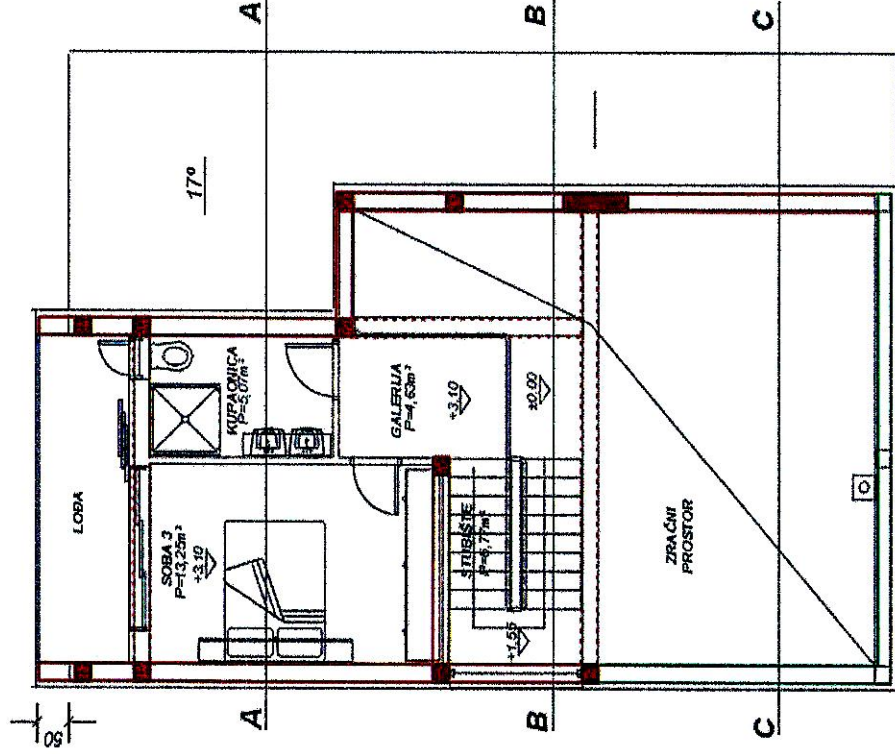

**Prilog 1. Prikaz nosivih elemenata i oslonaca**

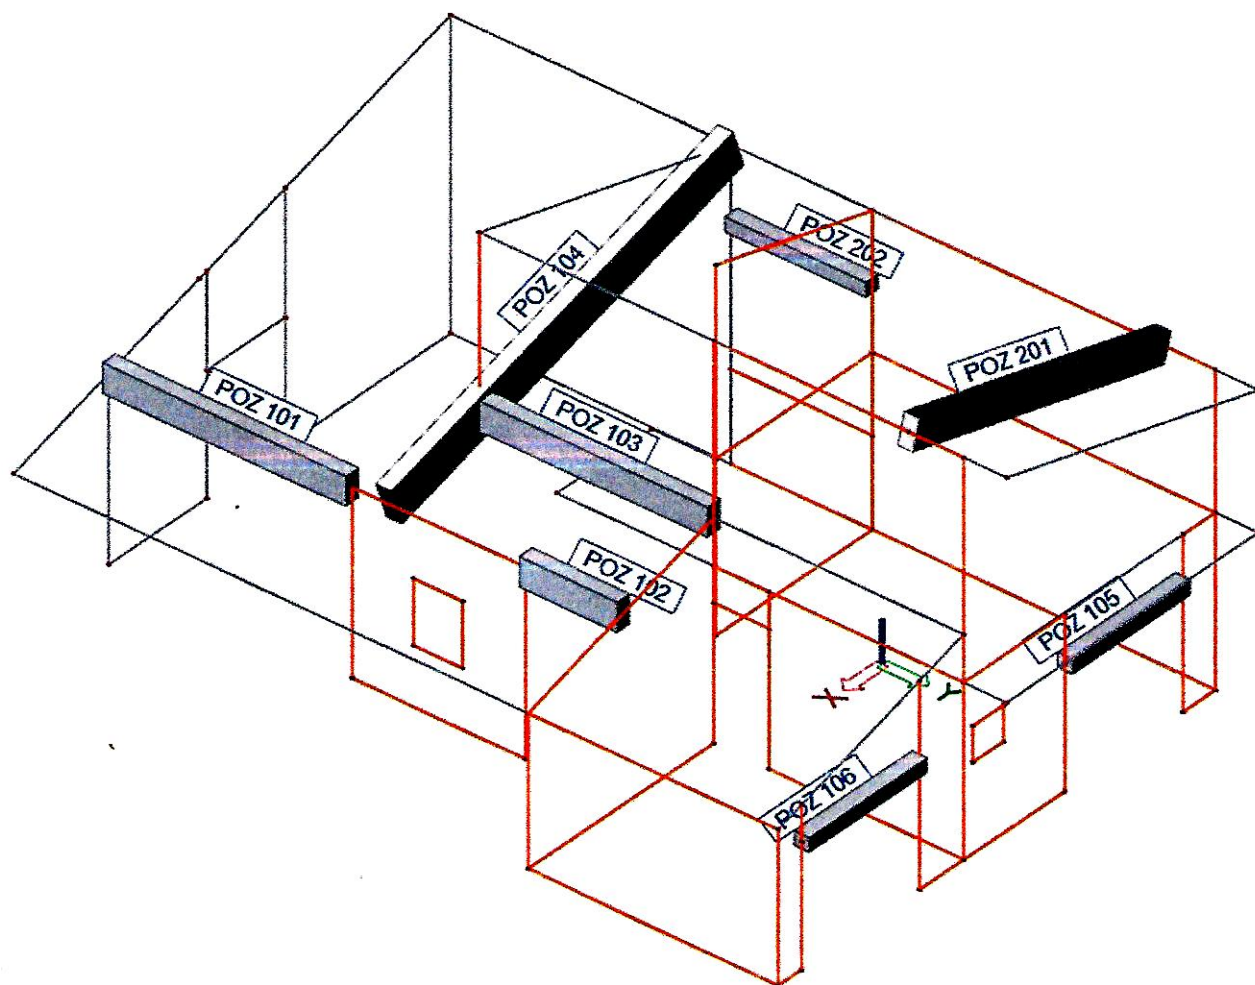

POZ 101	b/h = 25/50 cm
POZ 102	b/h = 25/50 cm
POZ 103	b/h = 25/50 cm
POZ 104	b/h = 25/70 cm
POZ 105	b/h = 25/25 cm
POZ 106	b/h = 25/25 cm
POZ 201	b/h = 25/40 cm
POZ 202	b/h = 25/25 cm

<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača			List	16	
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>					Nadnevak upisa	čet
							4.6.2020
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva			
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	20 °C	%	°C			



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača			List	25	
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>					Nadnevak upisa	četvrtak
							15.06.2020.
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva			
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	17 °C	59 %	°C			



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak		Naziv i središte izvođača		List	36
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	čet
					02.07.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	27 °C	50 %	°C		



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak		Naziv i središte izvođača		List	38
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	pon
					06.07.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	26 °C	45 %	°C		



List	46
Nadnevnik upisa	subota
05.09.2020.	


Istovar alata, pregled gradilista te kupovina potrebnog za rad. Zidanje simprolit blokom uz ugradnju betona u isti. Provlacenje armature kroz blokove.

voditelj građenja		
zidar	1	
radnik	2	






<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak		Naziv i središte izvođača		List	48
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	ut
					08.09.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	23 °C	%	°C		

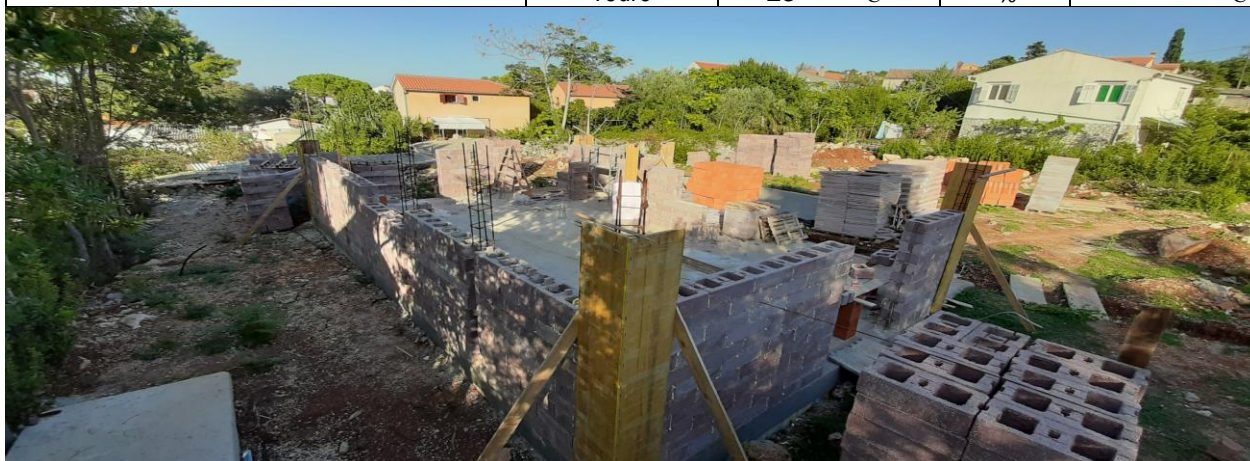

<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak		Naziv i središte izvođača		List	49
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	sr
					09.09.2020.	
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	25 °C	45 %	°C		





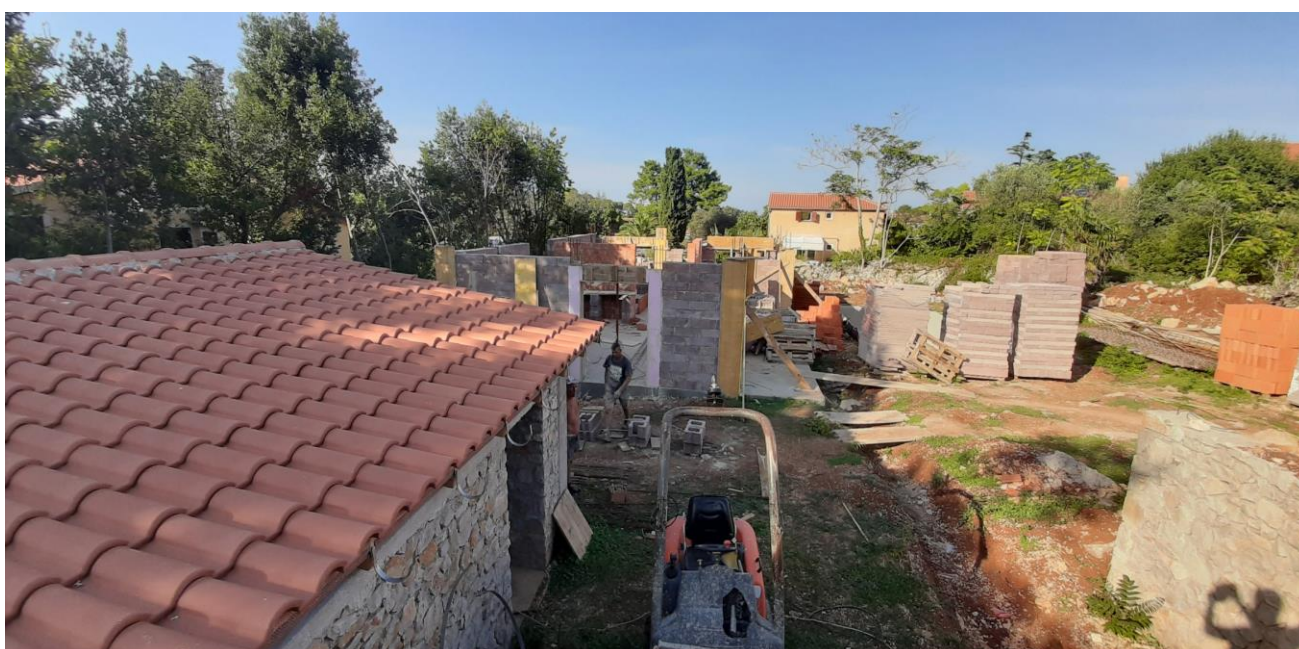


<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača	List	52
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>		Nadnevak upisa	čet
	12.09.2020.			



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača			List	<b>62</b>	
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>					Nadnevak upisa	petak
	25.9.2020						
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka		vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	22 °C		%	°C		



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača			List	<b>66</b>	
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>					Nadnevak upisa	pon
	28.9.2020						
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka		vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	20 °C		%	°C		

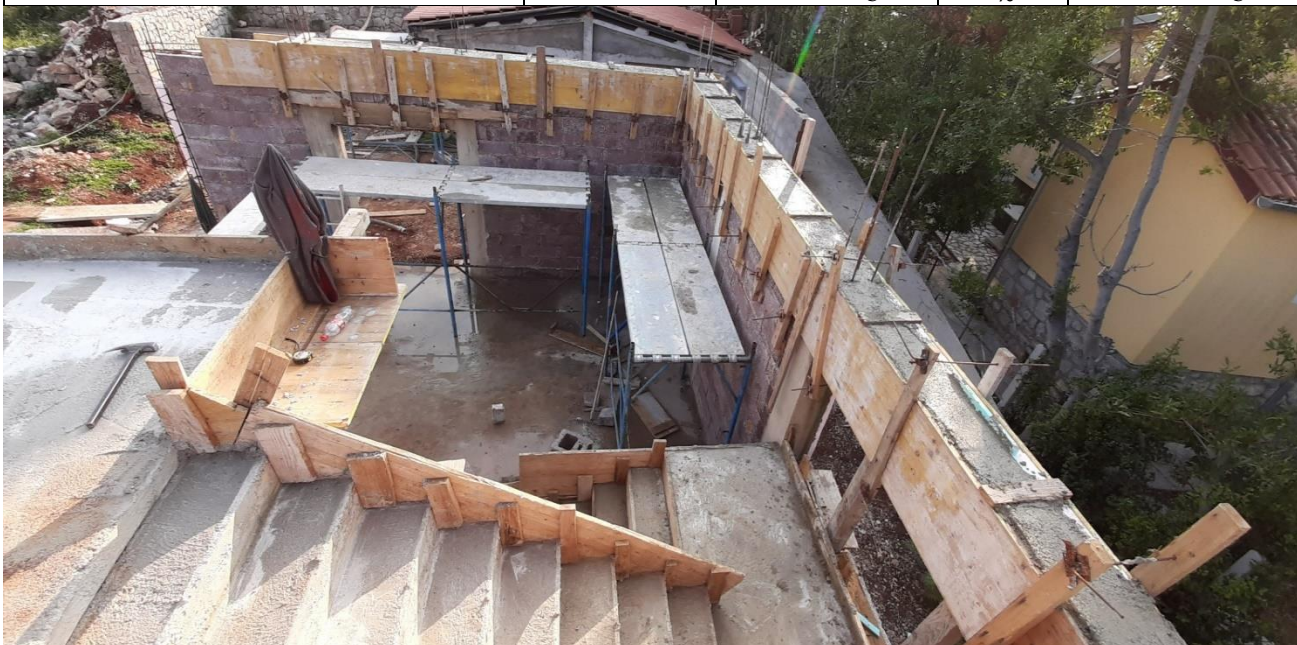

<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača		List	66	
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	ut
						29.09.2020.
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	20 °C	%	°C		



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača		List	67	
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	srijeda
						30.09.2020.
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	20 °C	%	°C		



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača	List	72
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>		Nadnevak upisa	ut
	06.10.2020.			

Postavljanje skele. Zidanje simprolit blokom uz ugradnju armature te betoniranje. Izrada oplate za AB stup uz ugradnju armature.



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	73
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	srijeda
	07.10.2020.			

Zidanje simprolit blokom. Izrada oplate za vertikalne serklaze i AB gredu. Betoniranje serklaza.



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak		Naziv i središte izvođača		List	<b>74</b>
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>		Nadnevak upisa		četvrtak	
			08.10.2020.			
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	17 °C	59 %	°C		



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak		Naziv i središte izvođača		List	<b>76</b>
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>		Nadnevak upisa		sub	
			10.10.2020			
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	21 °C	%	°C		



Pretovar nosaca gradje i armaturne sipke. Betoniranje vijenca stupova i nadvoja rucno.



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača	List	81
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>		Nadnevak upisa	pon
			19.10.2020.	

Izrada oplata za AB stup, stepenicu u bazenu te kosu AB krovnu ploču. Izrada i ugradnja armature. Betoniranje stepenice stupa i grede.





List	86
Nadnevak upisa	pon
26.10.2020.	




Demontaza i ciscenje oplata. Izrada oplata za kosu ploču te kosu gredu.



List	88
Nadnevak upisa	čet
29.10.2020.	

Izrada oplate za kosu gredu te izrada armaturne korpe za istu. Skidanje podupiraca. Izrada oplate za ab ploču. Postavljanje simprolit ploča na ploču.



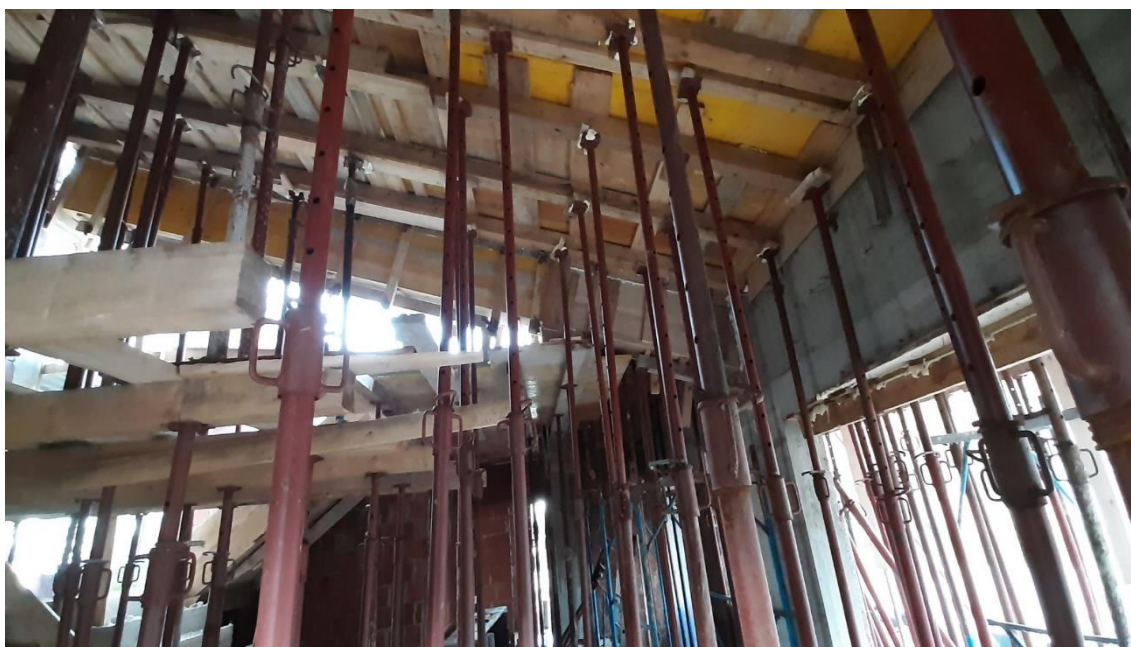

List	91
Nadnevak upisa	ut
3.11.2020.	

Postavljanje nosaca te provlacenje sipki za ukrutu kroz isti. Povezivanje sa vjencem i ostalom armaturom. Polaganje armaturnih mreza te povezivanje.





List	92
Nadnevak upisa	sr
04.11.2020.	

Priprema za betoniranje te betoniranje dijela kose AB ploče krova.

List	93
Nadnevak upisa	čet.
05.11.2020.	

Demontaza oplata. Ciscenje i spremanje gradilista.

List	94
Nadnevak upisa	pet.
06.11.2020.	

Popravak stroja. Zidanje pregradnih zidova.





List	97
Nadnevak upisa	sred
11.11.2020.	

ROH 070 Betoniranje betonske ploče/deke, ručna ugradnja betona, miješanje pomoću mješalice za beton, izvlačenje ravnalicom i niveliranje prilikom izvlačenja.

List	98
Nadnevak upisa	čet
12.11.2020.	

ROH 005 Izrada oplate za AB ploču - glatka. U cijenu uključena izrada oplate sa postavom gredica i podupirača m2 14.007245 ROH 007 Izrada trostrane oplate za AB grede - glatka. U cijenu uključena samo izrada oplate sa postavom gredica i podupirača - KVADRATURA BETONA m2 6.50


List	99
Nadnevak upisa	pet
13.11.2020.	

Izrada oplata za vertikalne serklaze. Izrada armaturnih korpi. Zidanje simprolit blokom uz ugradnju armature i betona u isti.



List	102
Nadnevak upisa	sr
18.11.2020.	

Zidanje simprolit blokom uz popunjavanje betonom. Izrada oplate za AB stup, izrada armature te ugradnja betona u isti. Demontaza oplate sa vertikalnih serklaza, greda, te AB ploce.

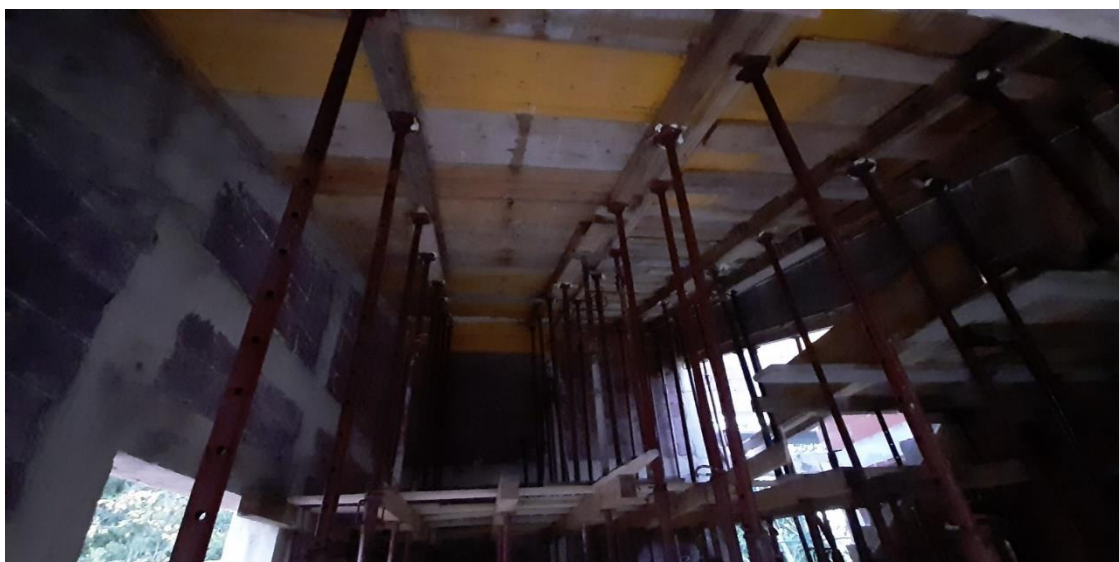


List	104
Nadnevak upisa	pet
20.11.2020.	

Izrada oplata za kosu AB ploču. Izrada armaturnih korpi.



List	105
Nadnevak upisa	sub
21.11.2020.	

Izrada oplata za kosu AB ploču. Postavljnje simprolit ploča uz ljepljenje rebara.

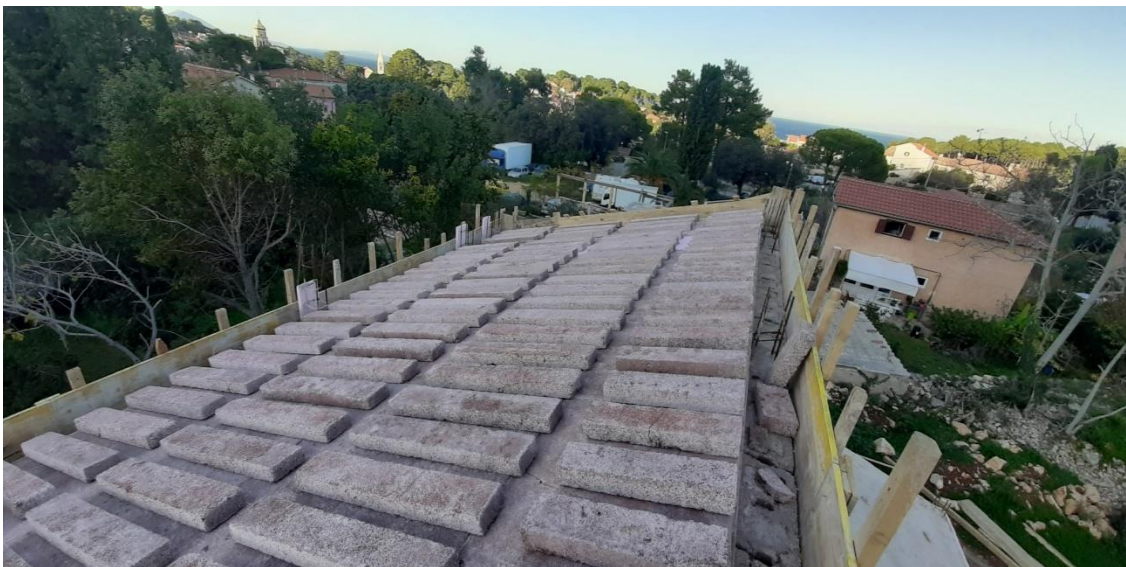



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	106
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon
	23.11.2020.			

Izrada armature za kosu AB ploču. Ugradnja korpi i nosaca, provlačenje armaturne sipke, postavljanje mreža.



List	107
Nadnevak upisa	ut
24.11.2020	

Istovar i preslagivanje materijala. Izrada oplata i armature za atiku.




110
pet
27.11.2020.

Mjenjanje nastavka na crijevu. Punjenje akumulatora. Razvlacenje crijeva. Postavljanje stirodura. Priprema za betonazu.



List	111
Nadnevak upisa	pon
30.11.2020.	

Izrada oplate za atiku. Ugradnja armature i stirodura. Betoniranje atike. Istovar kamiona na parkiralište

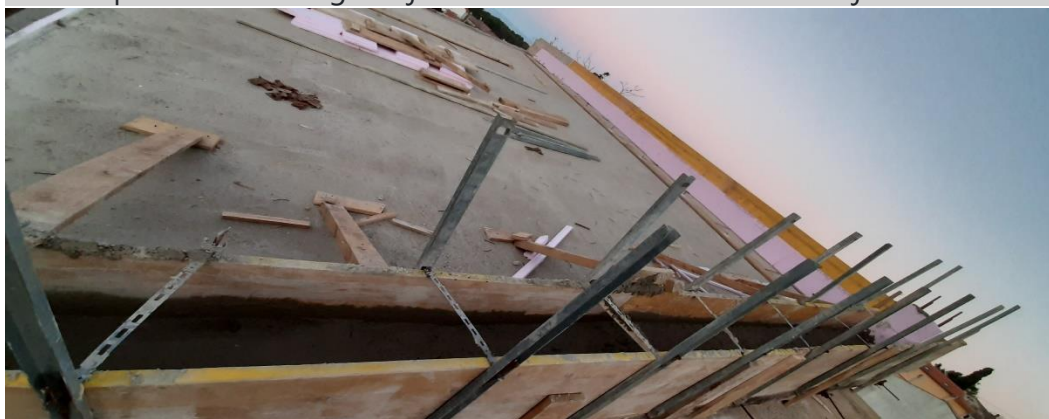

List	112
Nadnevak upisa	ut
01.12.2020.	

Demontaža oplate. Izrada oplate za atiku. Utovar te istovar materijala na gradilištu .



List	113
Nadnevak upisa	sr
02.12.2020.	

Demontaza oplata, greda i podupiraca u dnevnom boravku i terasi. Ciscenje i slaganje istih. Stemanje hilticom viska betona na zidovima i stropovima.



GRAĐEVNI  
DNEVNIK

Znak

Naziv i središte izvođača

List

126

**JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303  
Gornji Karin**

Nadnevak  
upisa

sub

19.12.2020.



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača		List	127	
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin				Nadnevak upisa	pon
						21.12.2020.
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj	vedro	22 °C	%	°C		

Nanosenje hidroizolacije. Opsivanje krova OSB pločama. Letvanje i kontraletvanje krova. Istovar crijeva.



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	128
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	ut
	22.12.2020.			



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača	List	132
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>		Nadnevak upisa	pet
			15.1.2020	

11256 FAS 023 Bojanje oluka (sa uključenom zaštitom)

m1







List	133
Nadnevak upisa	sub
16.01.2021.	

11276 ROH 140 Opšivanje krovne kose plohe OSB pločama pomoću iver/drvo vijaka i čavala

11277 ROH 141 Pokrivanje jednim slojem paropropusne krovne folije s odgovarajućim preklopom.

ROH 142 Letvanje i kontraletvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm za crijep.  
Ukupna m2 krovnog roštilja



List	135
Nadnevak upisa	utor
19.01.2021.	

Opsivanje krova OSB pločama, pokrivanje paropropusnom folijom. Letvanje i kontdaletvanje



List	136
Nadnevak upisa	sred.
20.01.2021.	

11385	ROH 145 Postavljanje zaštitne češalj trake	m1
11386	ROH 148 Postavljanje zaštitne perforirane PVC trake	m1
11387	ROH 146 Pokrivanje krova crijepom na ranije položene letve vijcima ili posebnim čavlima. Crijep se obavezno postavlja prema uputama proizvođača i projektne dokumentacije. Početni red se dodatno spaja mortom ili montažnom pjenom. Zabatni lijevi i desni crijep se postavlja prema uputama proizvođača - ukoliko se radi bez zabatnog crijepa ili lima onda se zabatni crijepovi dodatno utapaju u mort. OPISATI RAD U NAPOMENI	m2



List	142
Nadnevak upisa	ut
26.01.2021.	

ROH 147 Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za  
crijep prema uputama proizvođača i projektu. OPISATI RAD  
U NAPOMENI Eventualno utapanje sljemenjaka u obojenu  
maltu boje crijepa

m1



**GRAĐEVNI  
DNEVNIK**

Znak

Naziv i središte izvođača

List


111

**JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303  
Gornji Karin**

Nadnevak  
upisa

pon

15.02.2021.

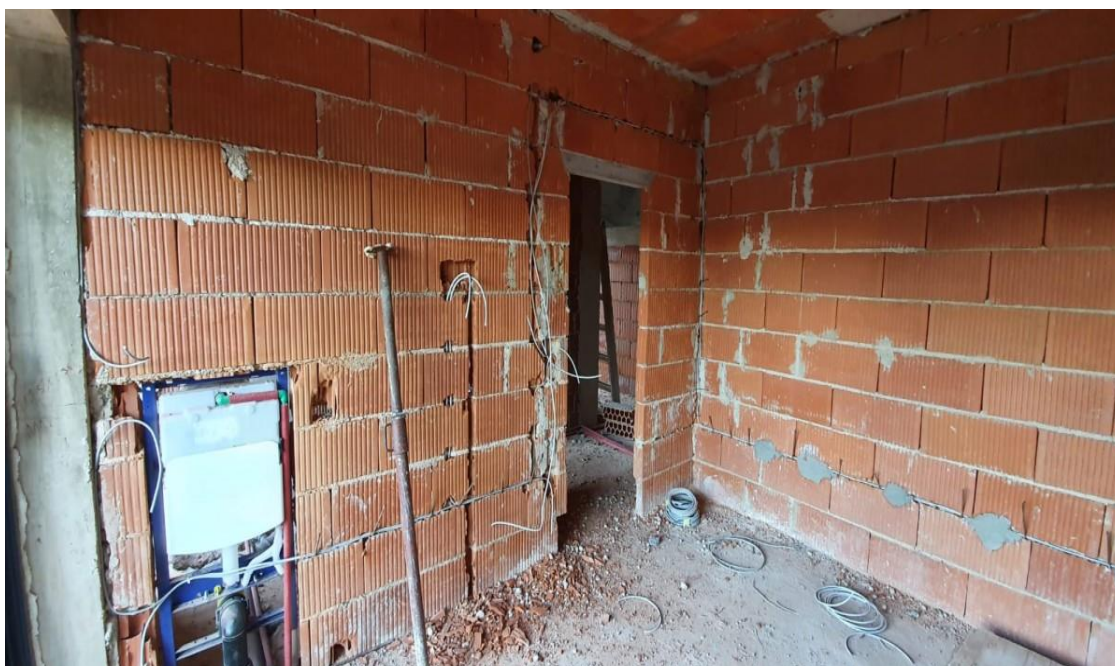

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	112
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	ut
	16.02.2021.			
12394	EL 023 Stemanje kanala za kabele( cigla, blok)			m1
12395	EL 025 Razvlacenje kabela kroz kanal / zid / kanalicu / strop itd			m1
12396	EL 024 Ugradnja podžbuknih kutija u zid			kom
12397	EL 027 Razvodni ormar ugradnja podžbukne kutije			kom
				m1



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak		Naziv i središte izvođača		List	118
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	sr
					21.02.2021	
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	14 °C	60 %	°C		







GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	118
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	sr
	22.02.2021			

Izrada oplata za stolariju. Betoniranje. Demontaza oplata. Rusenje zida radi stolarije. Zidanje pregradnim blokom. Odvoz smeća na deponoj. Asistiranje u izradi stolarije te instalacija.





<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača	List	125
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>		Nadnevak upisa	ut
	02.3.2021.			

Postavljanje limova i ubacivan je gume na prozore




GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	126
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	sr
	03.03.2021.			





List	136
Nadnevak upisa	sred.
17.03.2021.	

Postavljanje alu kutnika i lajsni za finu žbuku 96 m<sup>1</sup>, gruba obrada špaleta 11.70 m<sup>1</sup>, ugradnja špaletnog profila s mrežicom 15 m<sup>1</sup>, štemanje betonskog zida 2sata, ljepljenje simprolita na špalete 3 m<sup>1</sup>.

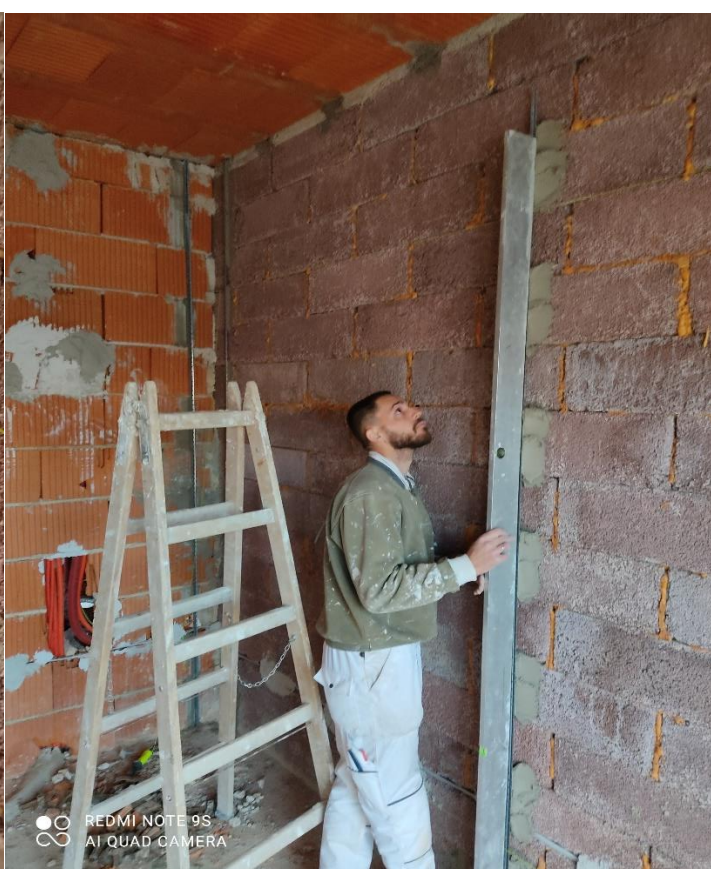

<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača		List	253	
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	ned
						23.5.2021
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	12 °C	%	°C		



Postavljanje alu kutnih profila za finu žbuku 80 m<sup>1</sup>. gruba obrada špaleta 18 m<sup>1</sup>





GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	139
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	sub.
	20.03.2021.			


Transport materijala i prenošenje na gradilištu. Ugradnja profila za žbukanje, ugradnja poklopaca za podžbukne kutije. Gruba obrada špaleta.



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	144
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet
	26.03.2021.			



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	233
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon
	03.05.2021.			

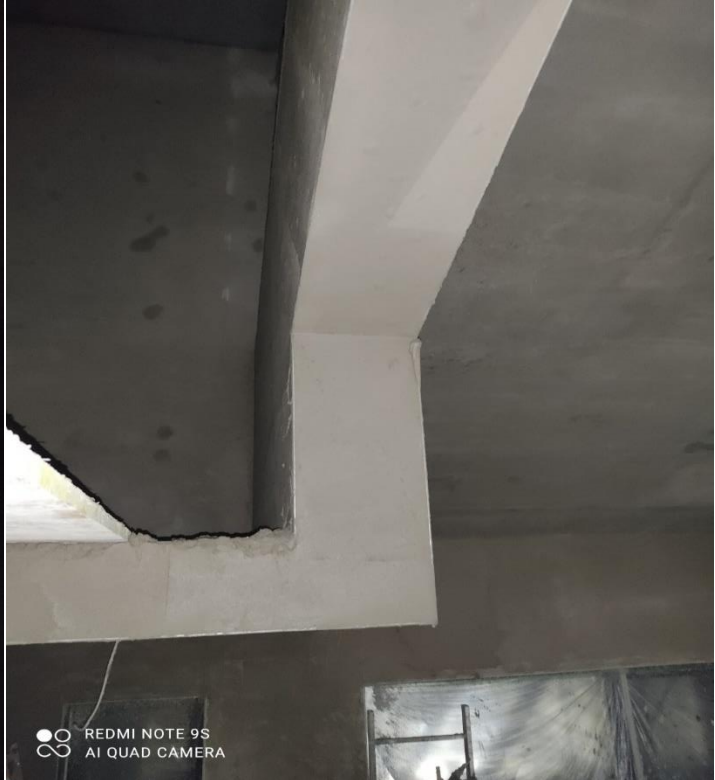




<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača	List	<b>228</b>
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>		Nadnevak upisa	sred
	28.04.2021.			
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	20 °C	%	°C



List	136
Nadnevak upisa	sred.
17.03.2021.	

Postavljanje alu kutnika i lajsni za finu žbuku 96 m<sup>1</sup>, gruba obrada špaleta 11.70 m<sup>1</sup>, ugradnja špaletnog profila s mrežicom 15 m<sup>1</sup>, štemanje betonskog zida 2sata, ljepljenje simprolita na špalete 3 m<sup>1</sup>.

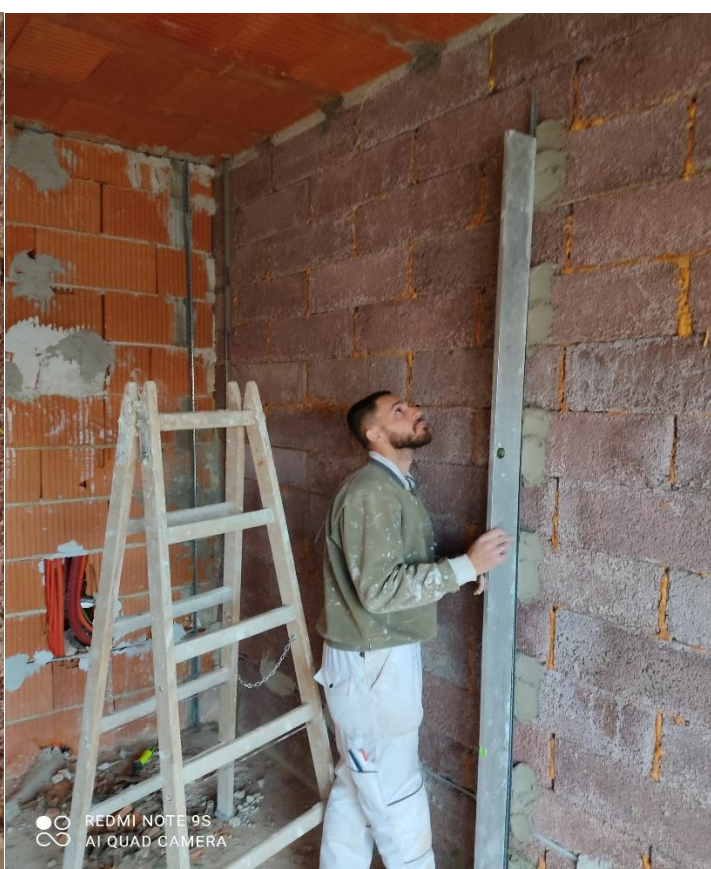

GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	137
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	čet.
	18.03.2021.			

Postavljanje Alu kutnih profila za finu zbuku 93.30 m1, gruba obrada špaleta 10.28 m1. zatvaranje geberit kotlića 2 m2 , zatvoranje cjevi 3 m1



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača		List	253	
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>				Nadnevak upisa	ned
						23.5.2021
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva		
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	12 °C	%	°C		



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	143
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	četv
	25.03.2021.			
13989	ZAV 034 Brušenje zidova i stropova nakon gletanja, kombinirano strojno i ručno (ne knauf spojevi)			m2
13990	FAS 008 Ugradnja fasadnog PVC špaletnog profila s mrežicom (ab traka)			m1






GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	144
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet
	26.03.2021.			




GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	233
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	pon
	03.05.2021.			

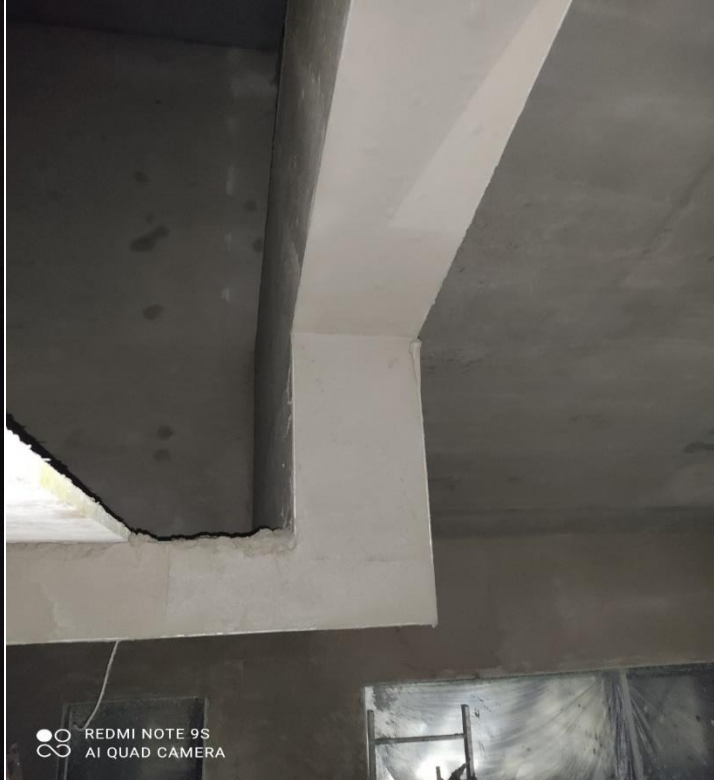



<b>GRAĐEVNI DNEVNIK</b>	Znak	Naziv i središte izvođača		List	228
	<b>JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin</b>			Nadnevak upisa	sred
	28.04.2021.				
Naziv građevine / dijela građevine / radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	vlažnost	Temperatura gradiva	
<b>Stambena građevina, (P+1), pomoćni objekt (P), k.č.347/3 Veli Lošinj</b>	vedro	20 °C	%	°C	



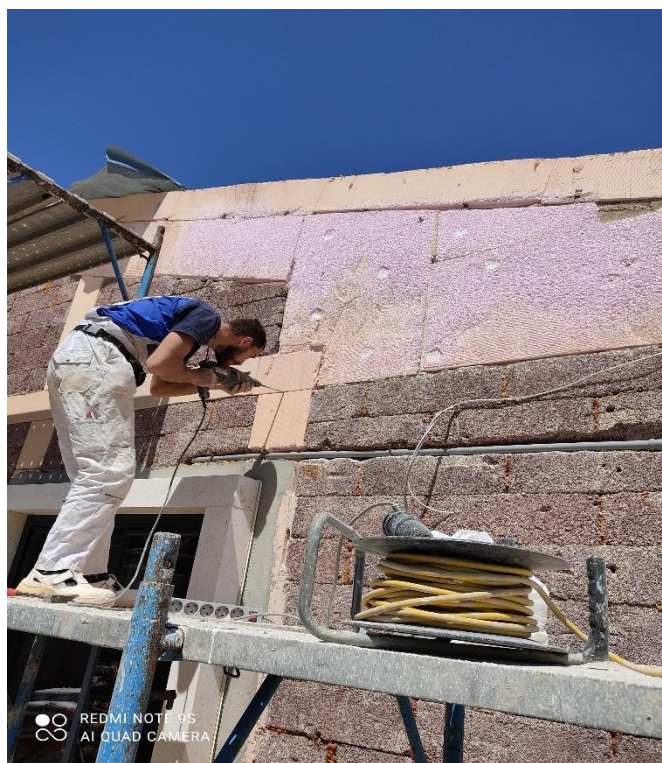

Montaza skele 85 m2, brusenje stiropora 7 m2, tiplanje stiropora 120 komada, pretovar materijala sa kamiona na mali kamion na parkingu i prijevoz na gradliste, te istovar

List	234
Nadnevak upisa	ut
04.05.2021.	

Postavljanje Alu kutnih profile za zbukanje na fasadu 80 m<sup>1</sup>, ciscenje gradliste, utovar i odvoz otpadnog materijala, nanos ljepila 15 m<sup>2</sup>, dovoz i istovar materiala 3 palete.



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	235
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	sreda
	05.05.2021.			

15569 ZAV 053 Grubo žbukanje zidova m2 80.00 48.28 3862.4 kn



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	237
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet
	07.05.2021.			

Zaštita prozora 5 komada, lijepljenje stirodura na fasadu 4m<sup>2</sup>, nanos ljepila i mrežice 15m<sup>2</sup>



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	239
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	ned
				9.5.2021



Brusenje zbuke na fasadi 75m2, rašalivanje oplata od daske, rezajne ugrađenih ankera 20 komada, postavljanje Alu kutnika s mrežicom 10m1.



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	235
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	sreda
	05.05.2021.			

15569 ZAV 053 Grubo žbukanje zidova m2 80.00 48.28 3862.4 kn



# GRAĐEVNI DNEVNIK

Znak

Naziv i središte izvođača

List

239

**JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303**  
**Gornji Karin**

Nadnevak  
upisa

ned

9.5.2021



Brusenje zbuke na fasadi 75m2, rašalivanje oplata od daske, rezajne ugrađenih ankera 20 komada, postavljanje Alu kutnika s mrežicom 10m1.



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	263
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	sr
	2.6.2021			



GRAĐEVNI DNEVNIK	Znak	Naziv i središte izvođača	List	265
	JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303 Gornji Karin		Nadnevak upisa	pet
	4.6.2021			

Ugradnja kamenih ploča na rub krovišta 12m1, ugradnja limenog okvira, te hidroizolacija dimnjaka, nanos ljepila i mrežice 2m2, nanos 2. sloja ljepila na AB grede 3 strane 30m1





# GRAĐEVNI DNEVNIK

Znak

Naziv i središte izvođača

List

319

**JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303  
Gornji Karin**

Nadnevak  
upisa

srijeda-srijeda

01.12.-08.12/2021



**GRAĐEVNI  
DNEVNIK**

Znak

Naziv i središte izvođača

List

320

**JADRIA MODUL j.d.o.o., OIB: 10713534303  
Gornji Karin**

Nadnevak  
upisa

srijeda-srijeda

09.12.-16.12/2021

